

PHASE 1.1

Préparation montage arène

du 15 au 28 octobre 2018
10 jours ouvrables

P 77% disponible
342 places de parc

P 10 places handicapés

10 jours ouvrables
Début des travaux de fondation
et pose des pieux.

Zones arène & plateforme
Travaux et installations

8 phases
Montage arène (9 mois)

oct	nov	déc	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil



Lac

PHASE 1.2

Préparation montage arène

du 29 octobre au 31 octobre 2018
3 jours ouvrables

P 83% disponible
370 places de parc


3 jours ouvrables
Début des travaux de fondation
et pose des pieux.

P 8 places handicapés

Zones arène & plateforme
Travaux et installations

8 phases
Montage arène (9 mois)

oct	nov	déc	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil

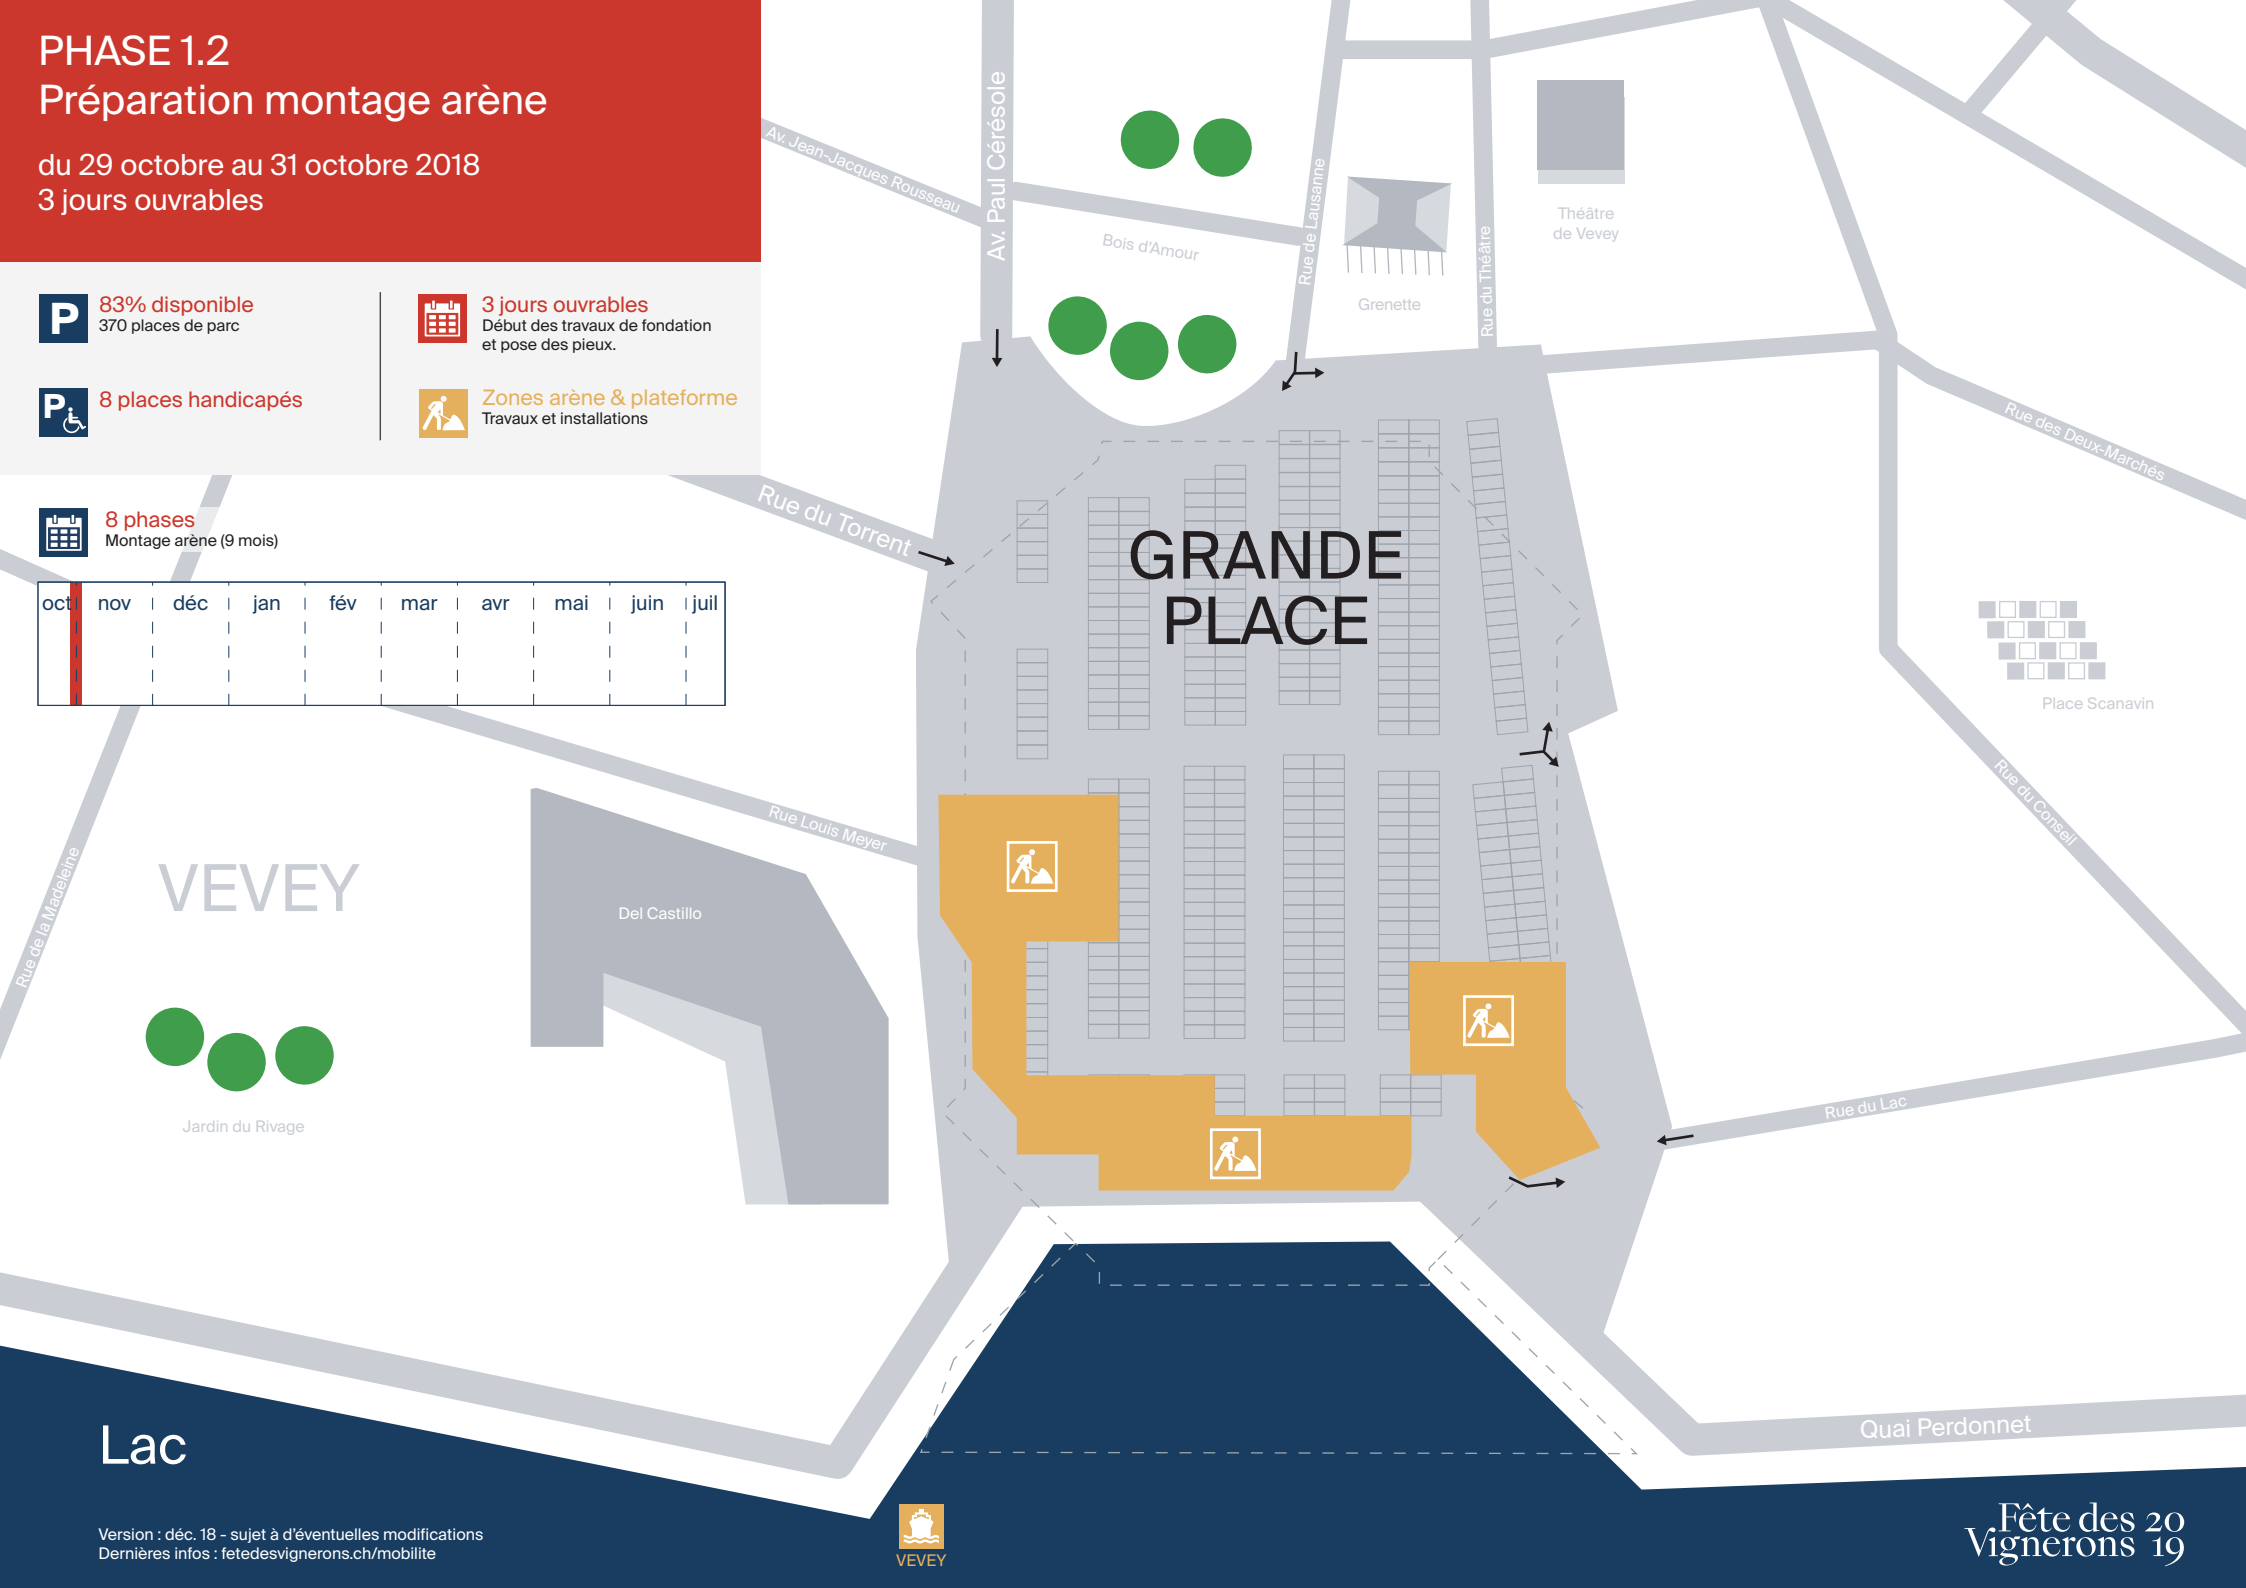

Lac

PHASE 2

Préparation montage arène

du 1er au 11 novembre 2018
7 jours ouvrables

P 65% disponible
289 places de parc

7 jours ouvrables
Travaux de fondation et
pose des pieux.

P 6 places handicapés

Zones arène & plateforme
Travaux et installations

8 phases
Montage arène (9 mois)

oct	nov	déc	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil
2									



Lac

PHASE 3

Préparation montage arène


St-Martin

du 12 au 14 novembre 2018
2 jours ouvrables

P Indisponible


 2 jours ouvrables
Repli St-Martin

P Indisponible

 Zones arène & plateforme
Travaux et installations

 8 phases
Montage arène (9 mois)

oct	nov	déc	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil

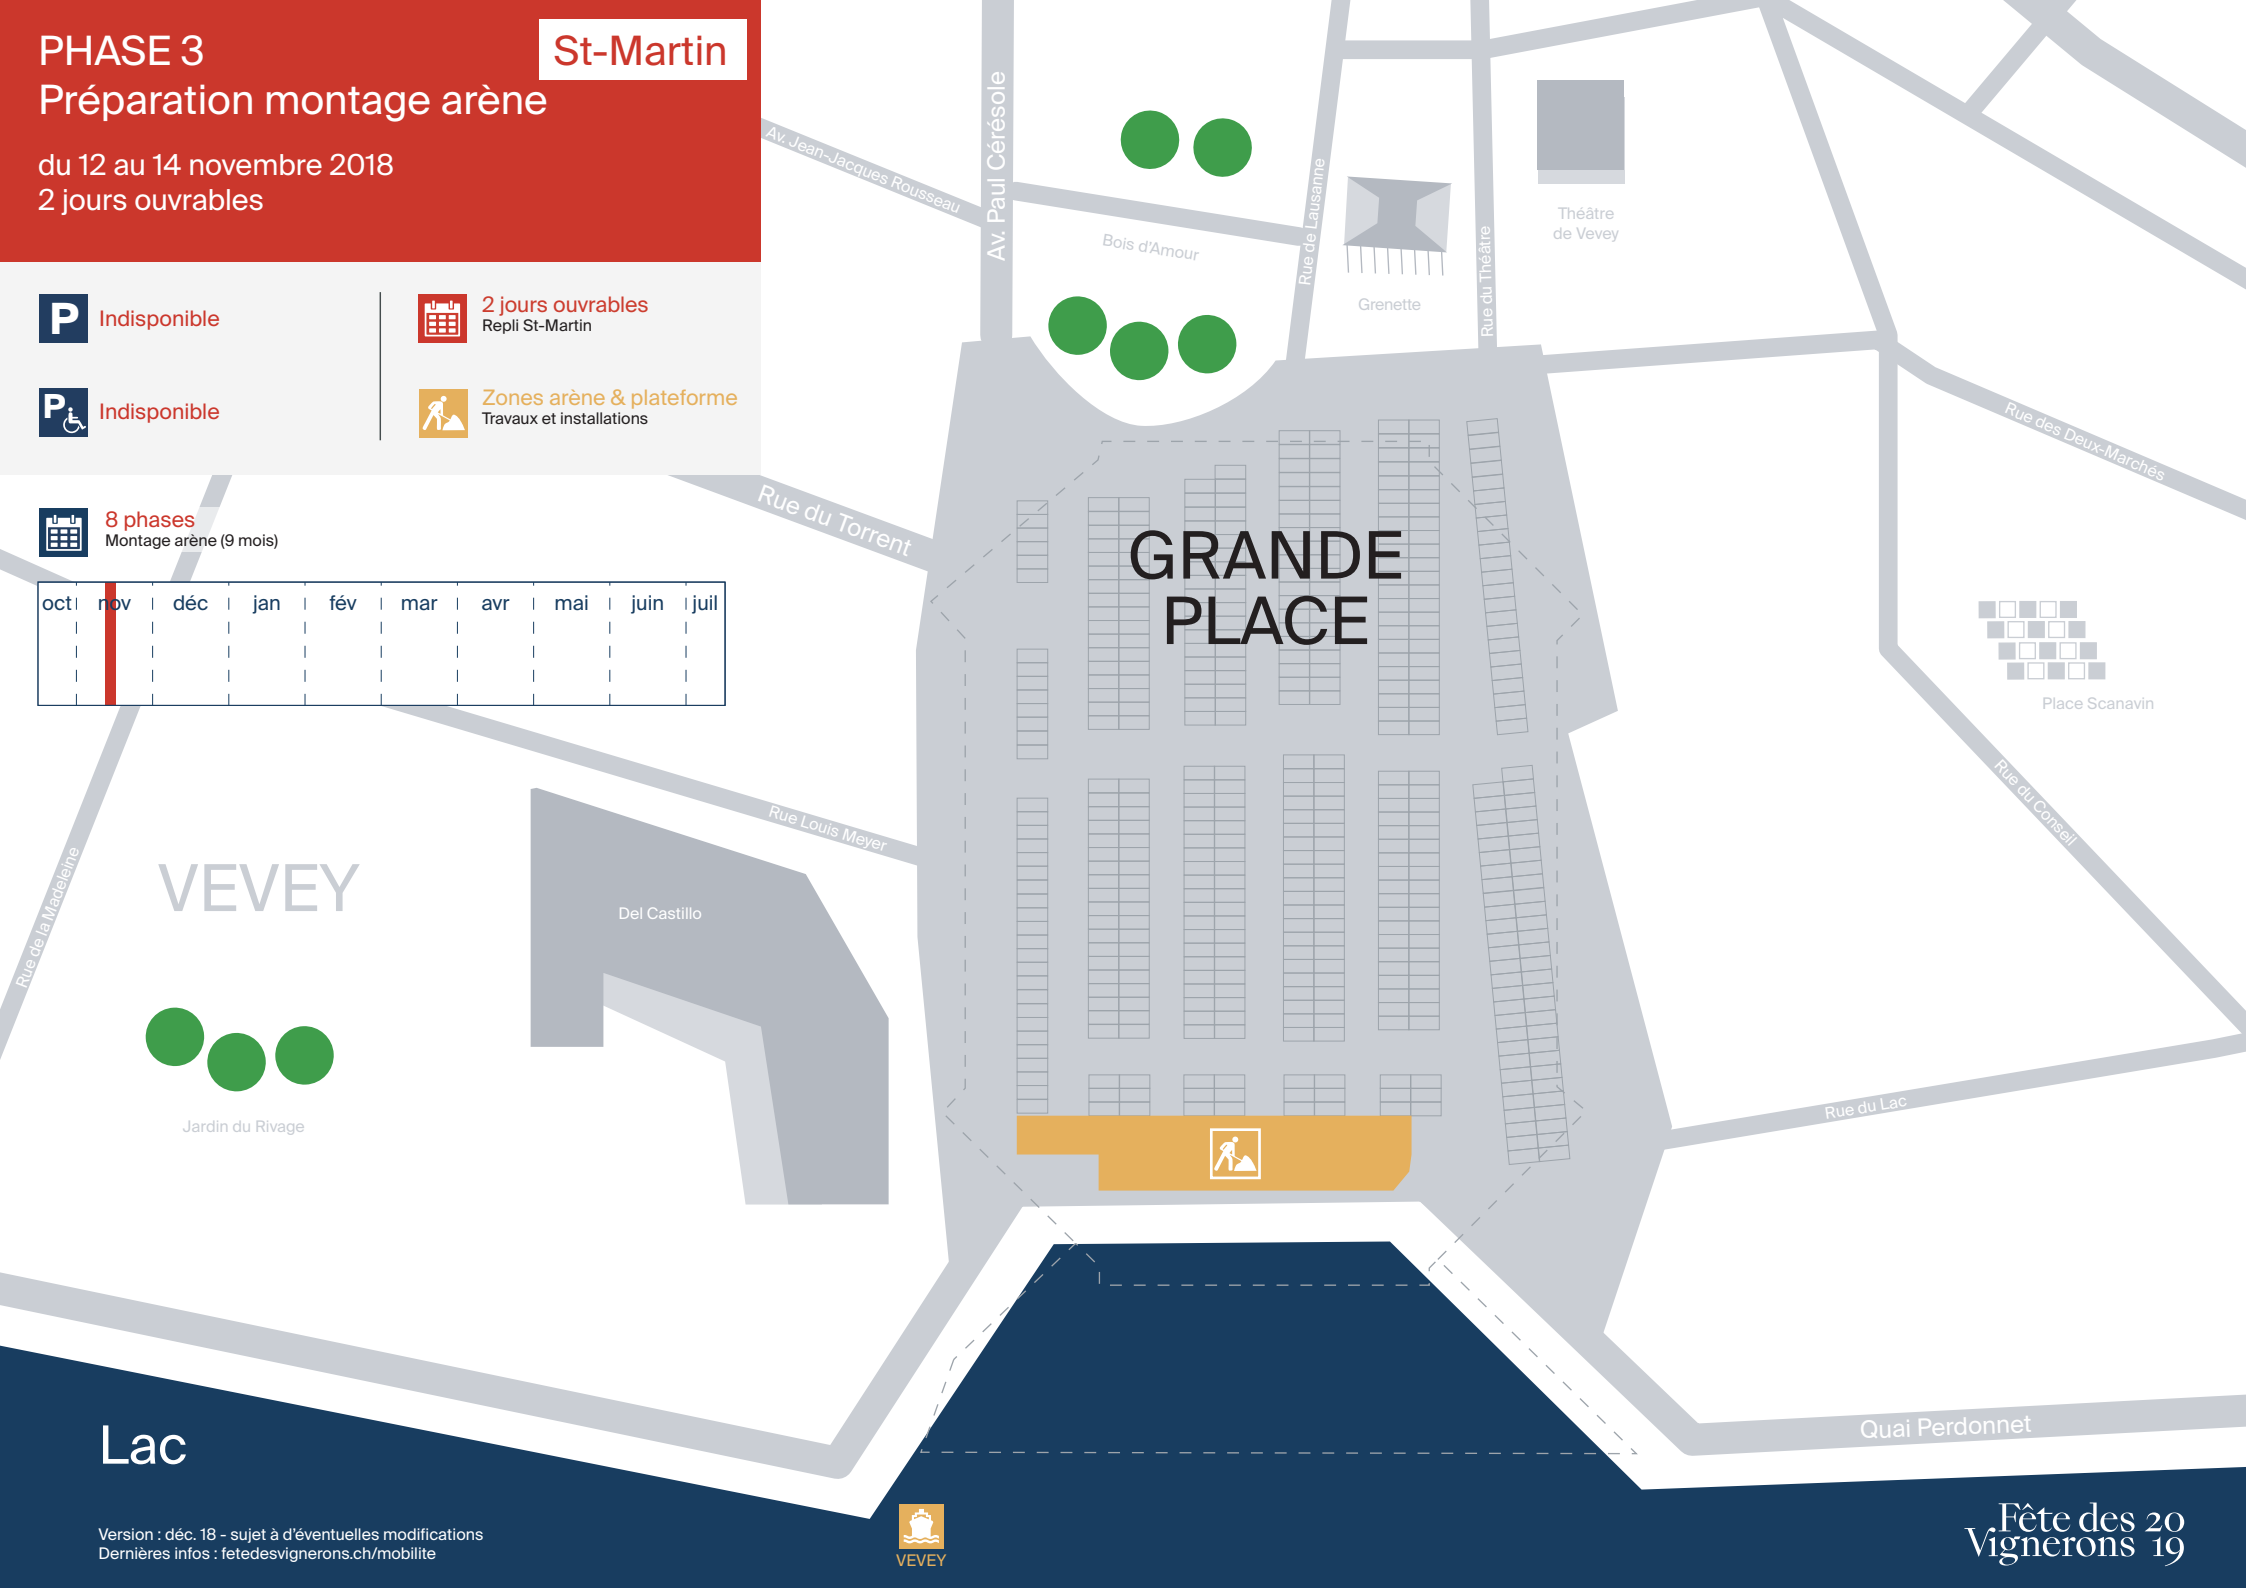

Lac

PHASE 4.1

Préparation montage arène

du 14 au 18 novembre 2018
4 jours ouvrables

P 59% disponible
264 places de parc


4 jours ouvrables
Début de la mise en place des
pieux de la plateforme.

P 5 places handicapés

Zones arène & plateforme
Travaux et installations

8 phases
Montage arène (9 mois)

oct	nov	déc	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil

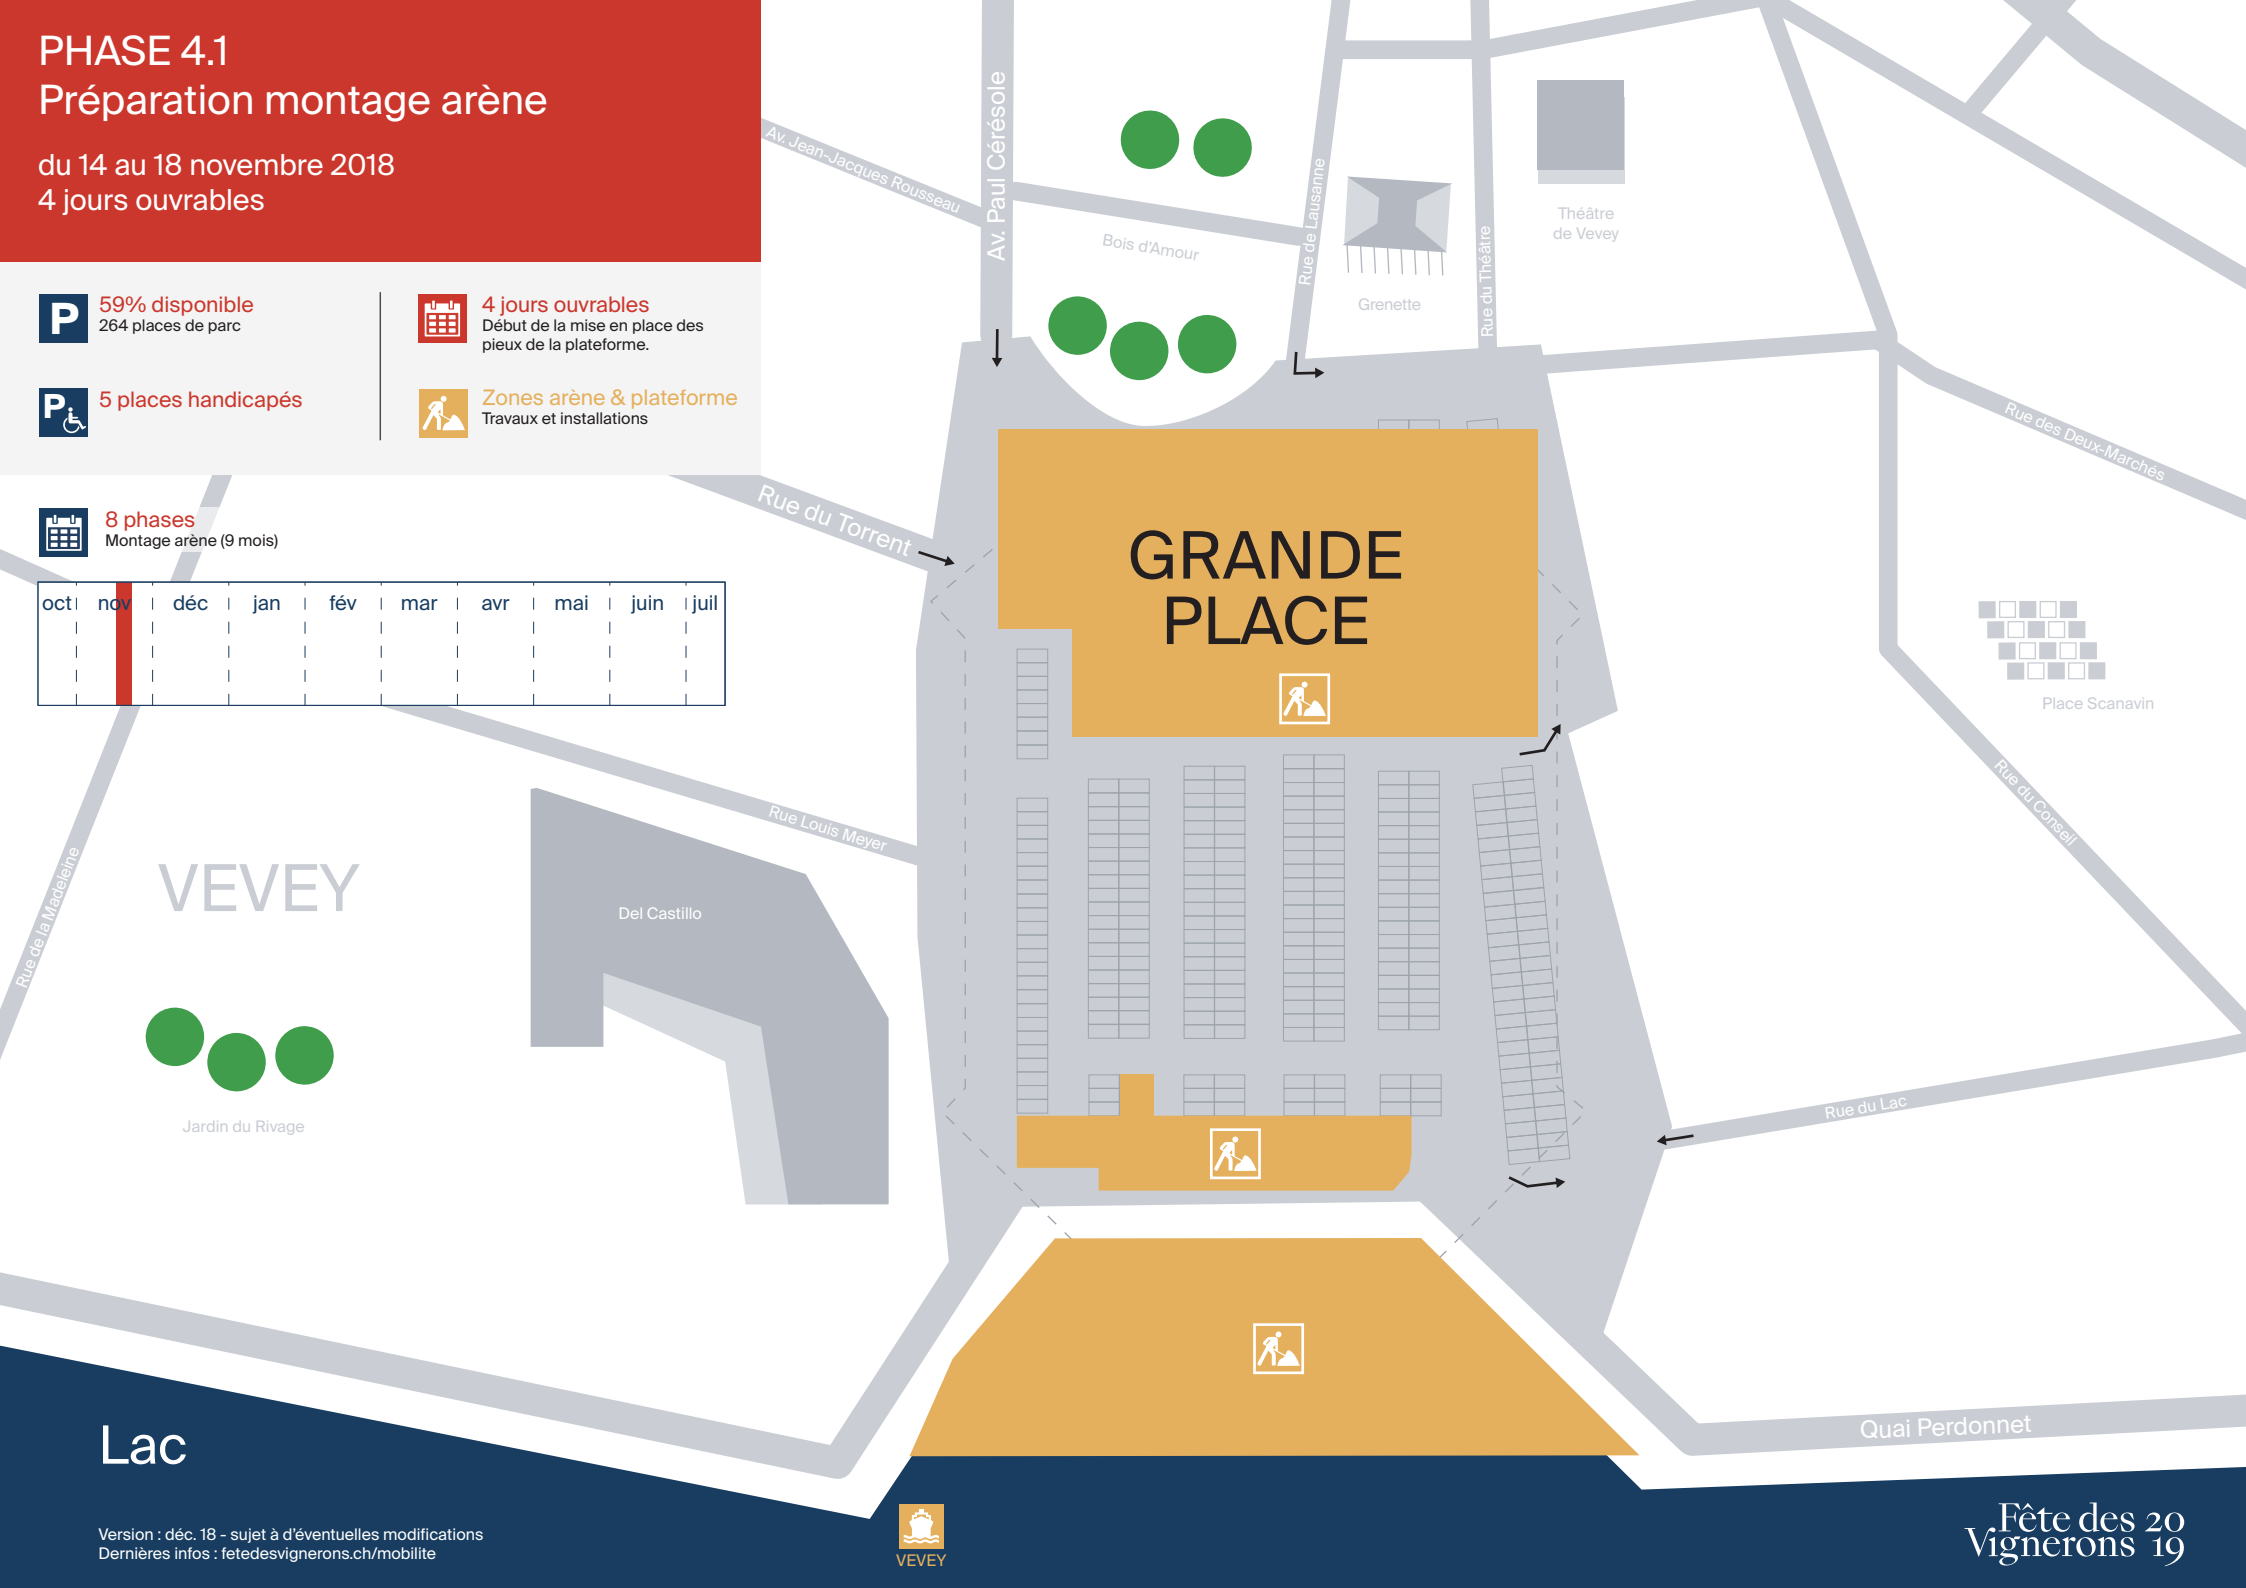

GRANDE PLACE

VEVEY

Lac

PHASE 4.2 Préparation montage arène

du 19 novembre au 21 novembre 2018
3 jours ouvrables

P 44% disponible
198 places de parc

3 jours ouvrables
Début de la mise en place des
pieux de la plateforme.

P 5 places handicapés

Zones arène & plateforme
Travaux et installations

8 phases
Montage arène (9 mois)

oct	nov	déc	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil



GRANDE PLACE

VEVEY

Del Castillo

Jardin du Rivage

Lac

PHASE 4.3

Préparation montage arène

du 22 novembre au 23 novembre 2018
2 jours ouvrables

P 54% disponible
240 places de parc

2 jours ouvrables
Début de la mise en place des
pieux de la plateforme.

P 5 places handicapés

Zones arène & plateforme
Travaux et installations

8 phases
Montage arène (9 mois)

oct	nov	déc	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil



Lac

PHASE 4.4

Préparation montage arène

du 26 novembre au 1er décembre 2018
6 jours ouvrables

P 46% disponible
206 places de parc


6 jours ouvrables
Début de la mise en place des
pieux de la plateforme.

P 5 places handicapés

Zones arène & plateforme
Travaux et installations

8 phases
Montage arène (9 mois)

oct	nov	déc	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil

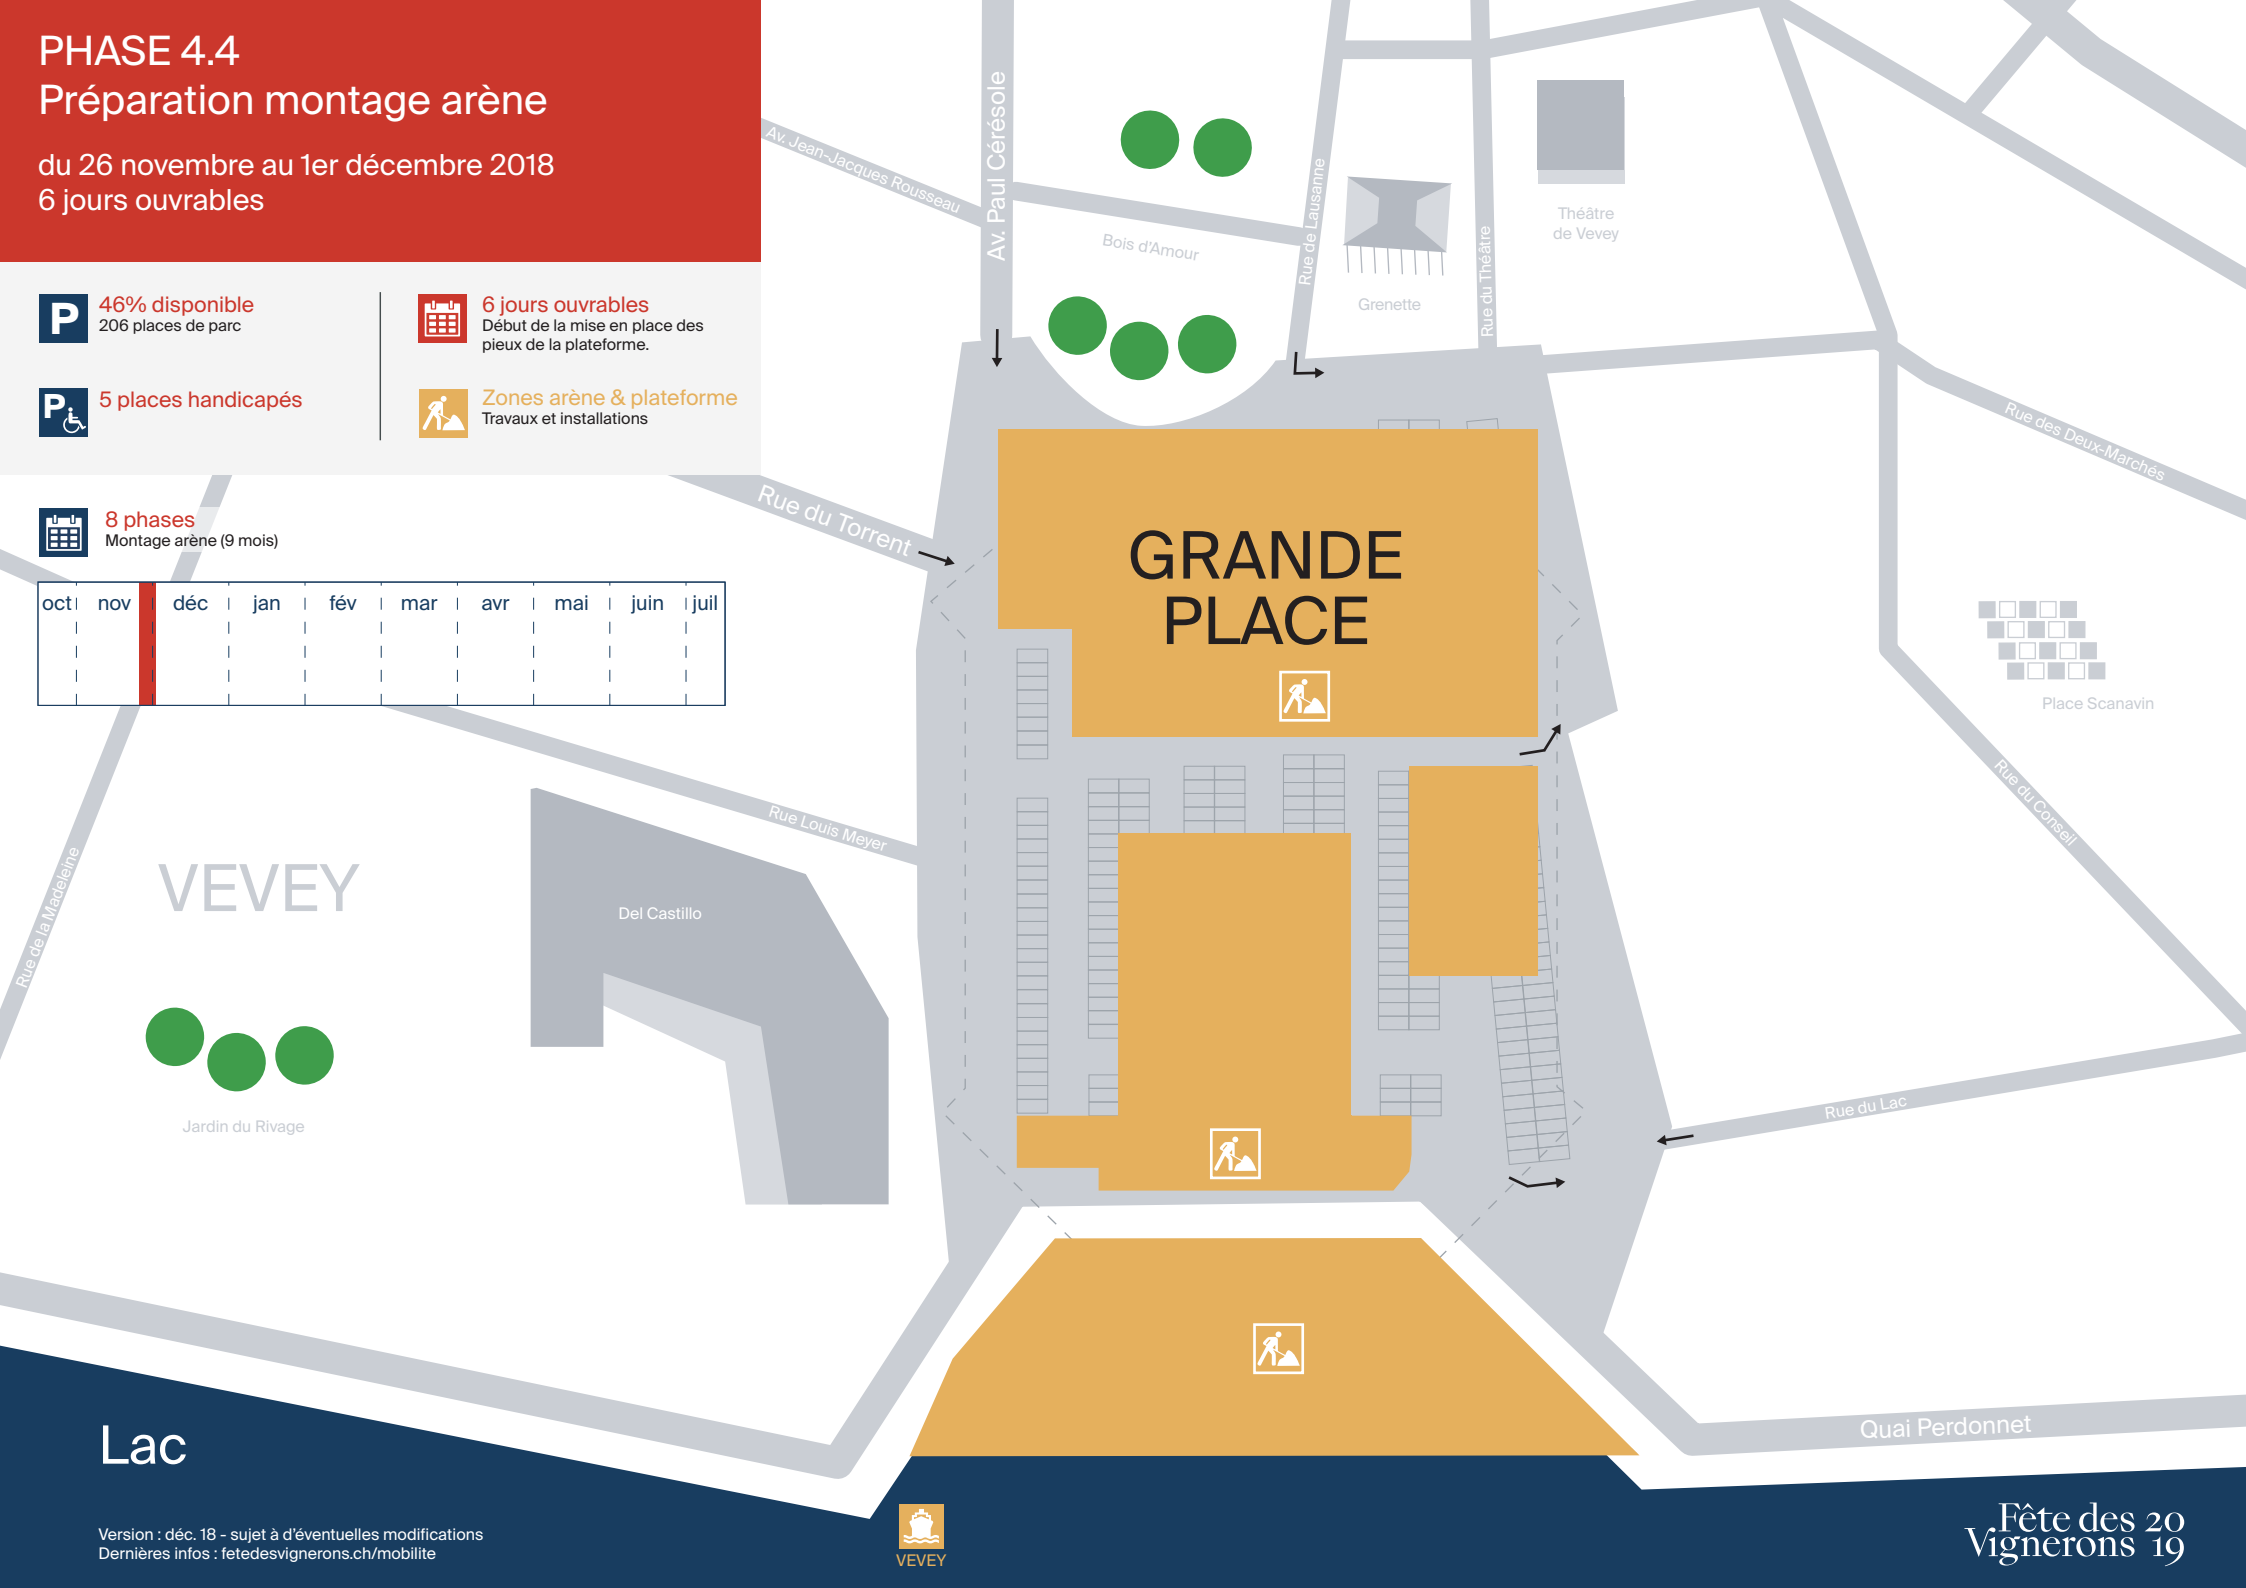

Lac

PHASE 5

Préparation montage arène

du 2 au 21 décembre 2018
15 jours ouvrables

P 82% disponible
366 places de parc


P 12 places handicapés

15 jours ouvrables
Fin des travaux de fondation
et des pieux.

Zones arène & plateforme
Travaux et installations

8 phases
Montage arène (9 mois)

oct	nov	déc	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil
		5							

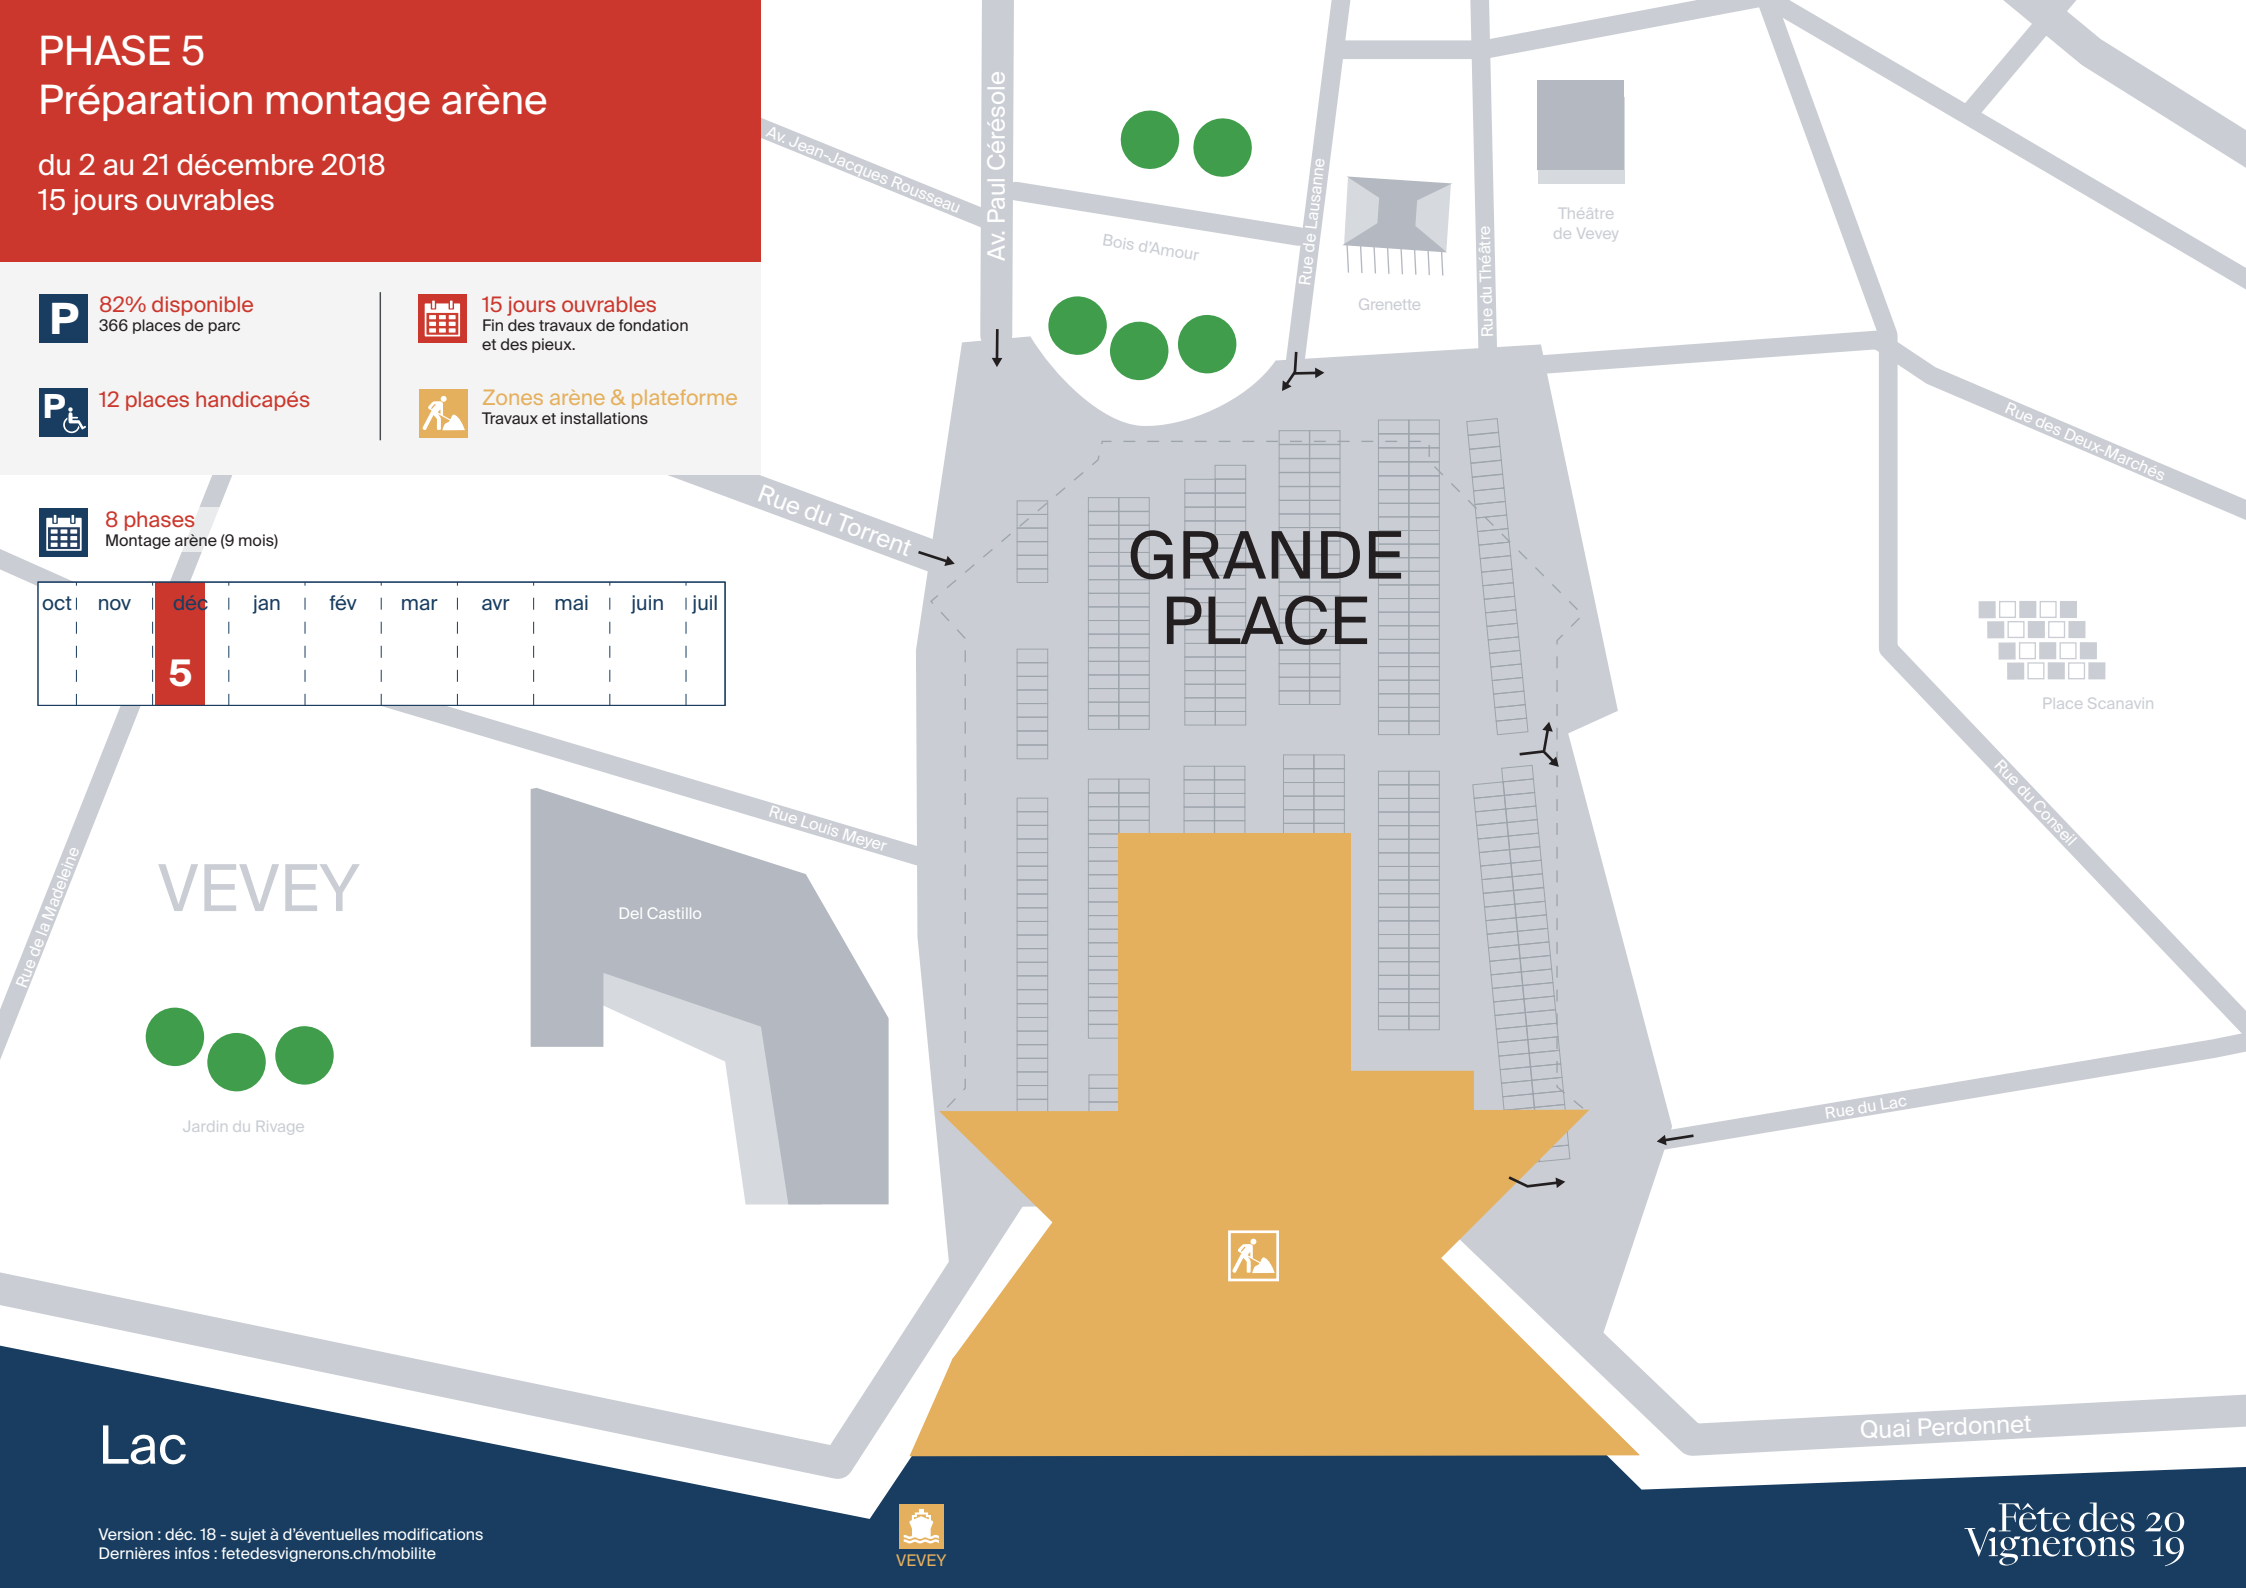

Lac

PHASE 6

Préparation montage arène

Noël

du 22 décembre 2018 au 2 janvier 2019
12 jours

P 100% disponible
443 places de parc


12 jours
Repli Noël

P 12 places handicapés

Zones arène & plateforme
Travaux et installations

8 phases
Montage arène (9 mois)

oct	nov	déc	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil
		6							

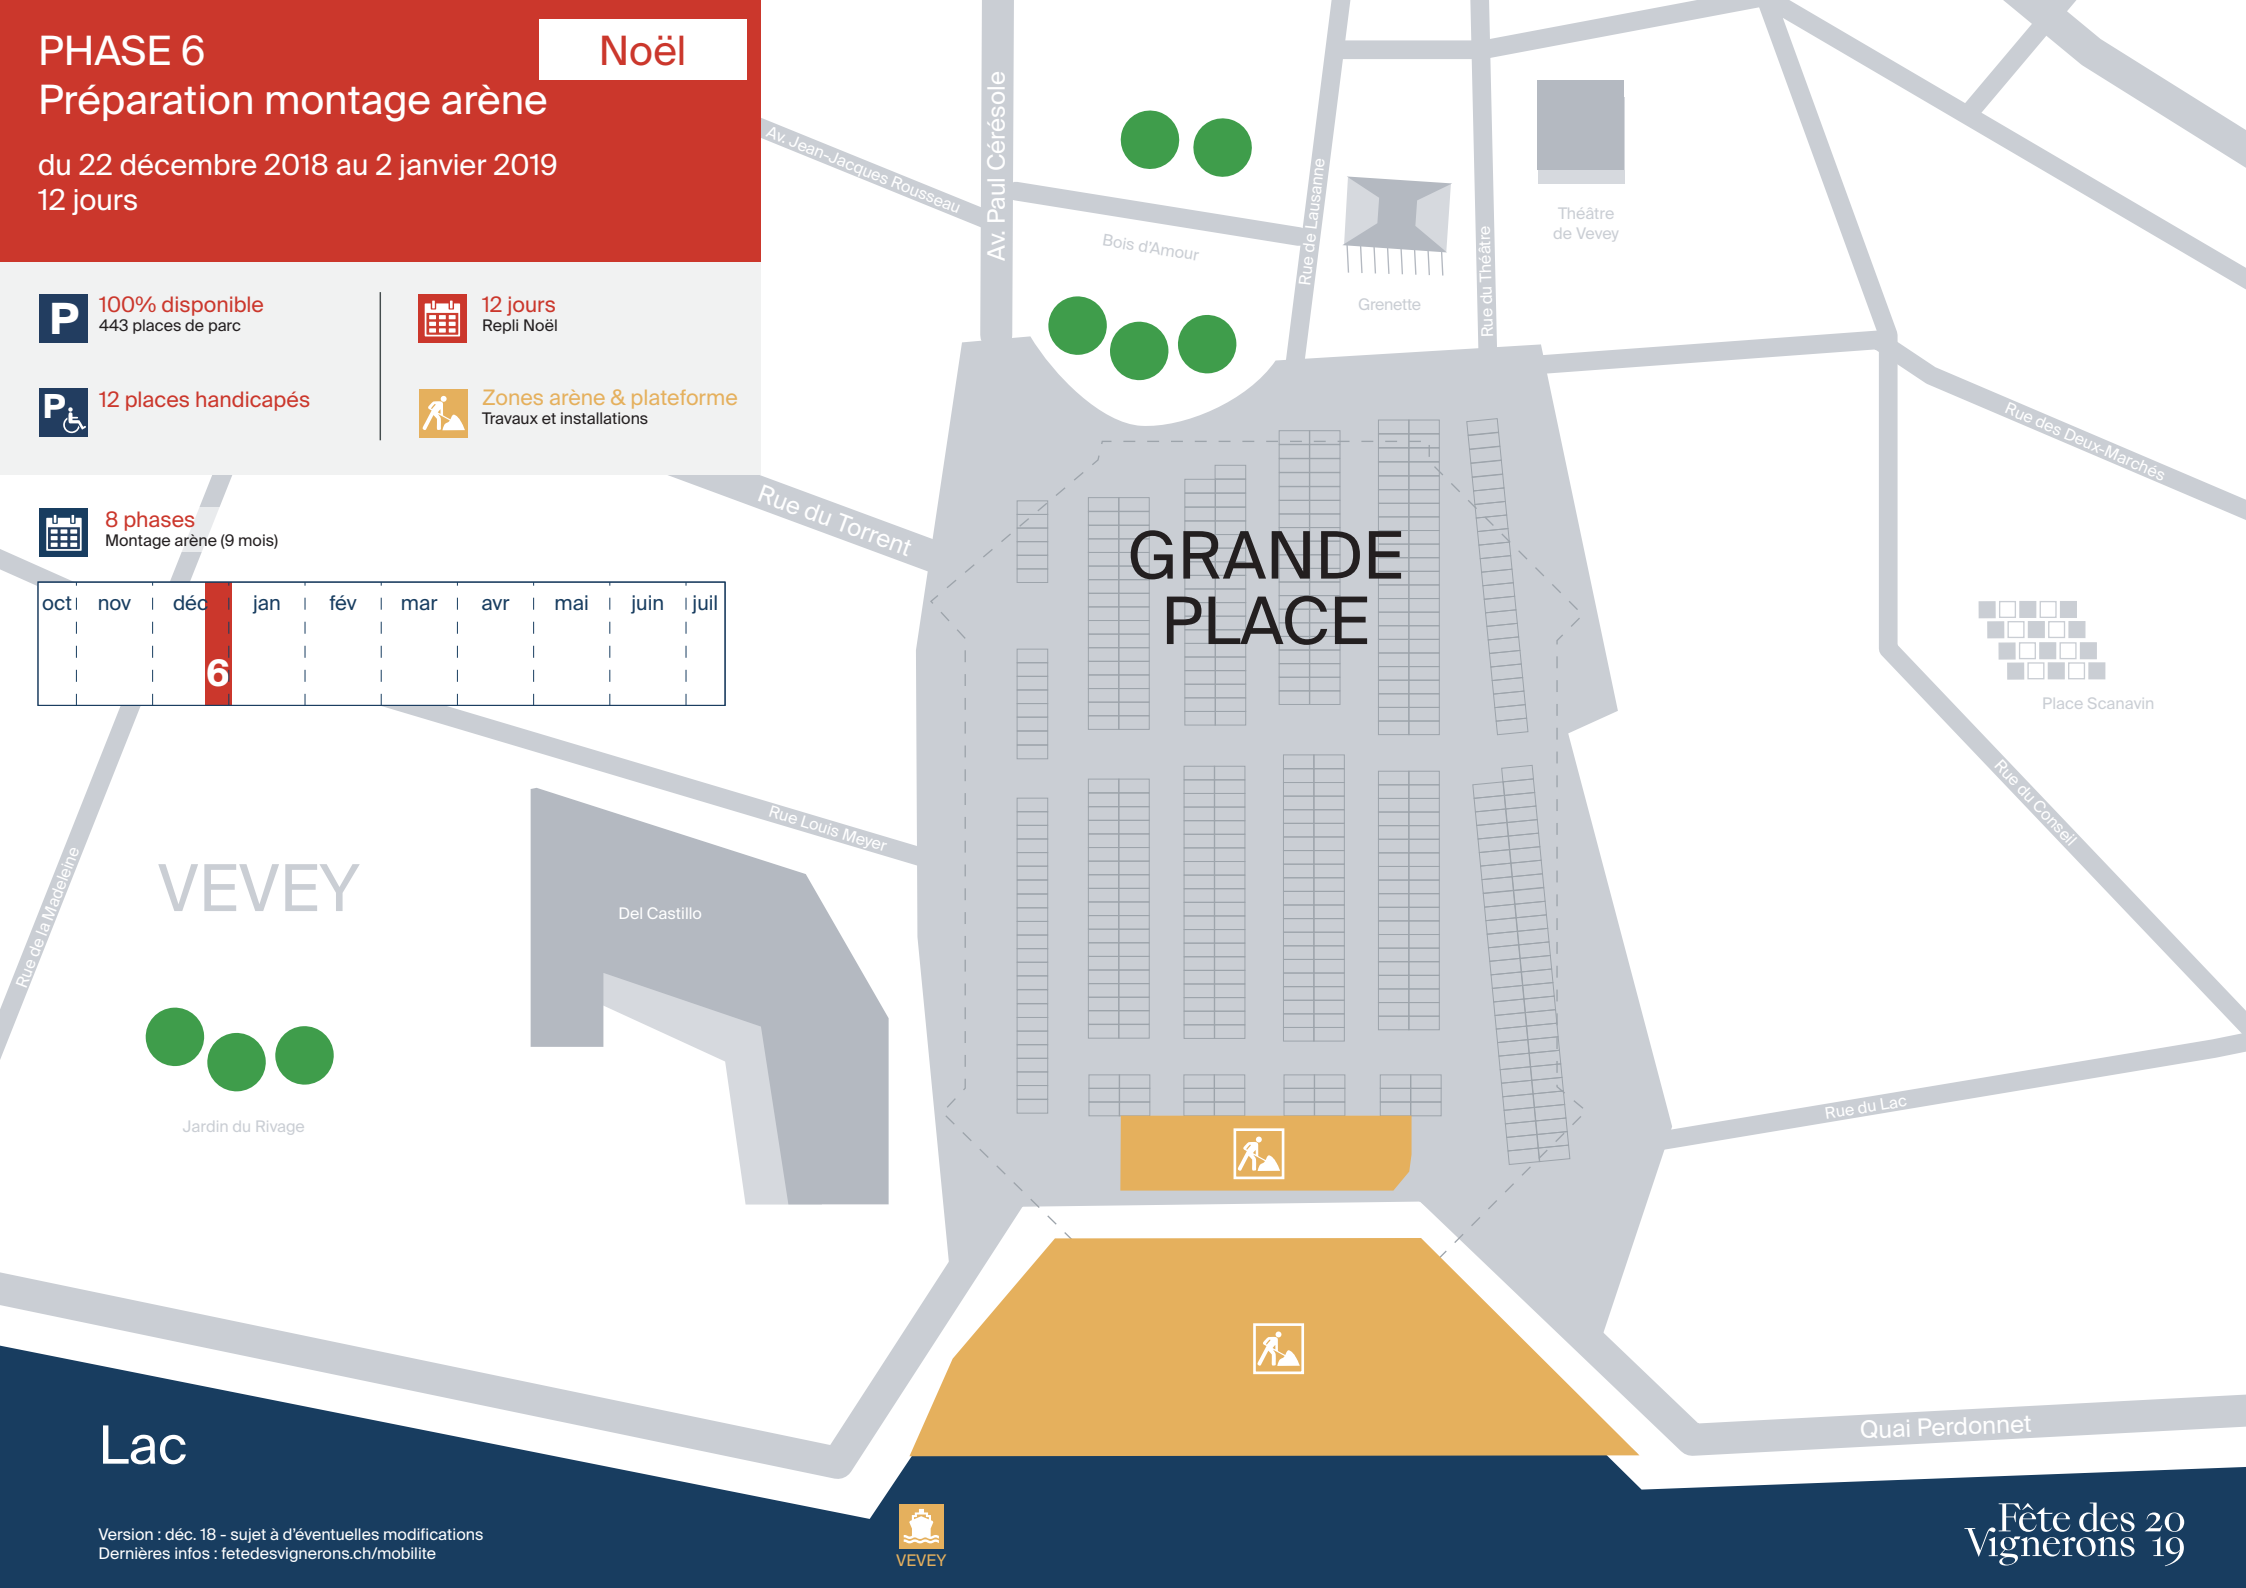

Lac

PHASE 7 Montage arène

du 3 janvier au 3 mars 2019
42 jours ouvrables

P Indisponible


P Indisponible

42 jours ouvrables
Montage de la charpente métallique,
des gradins et du plancher de la
plateforme.

Zones arène & plateforme
Travaux et installations

8 phases
Montage arène (9 mois)

oct	nov	déc	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil
			7						

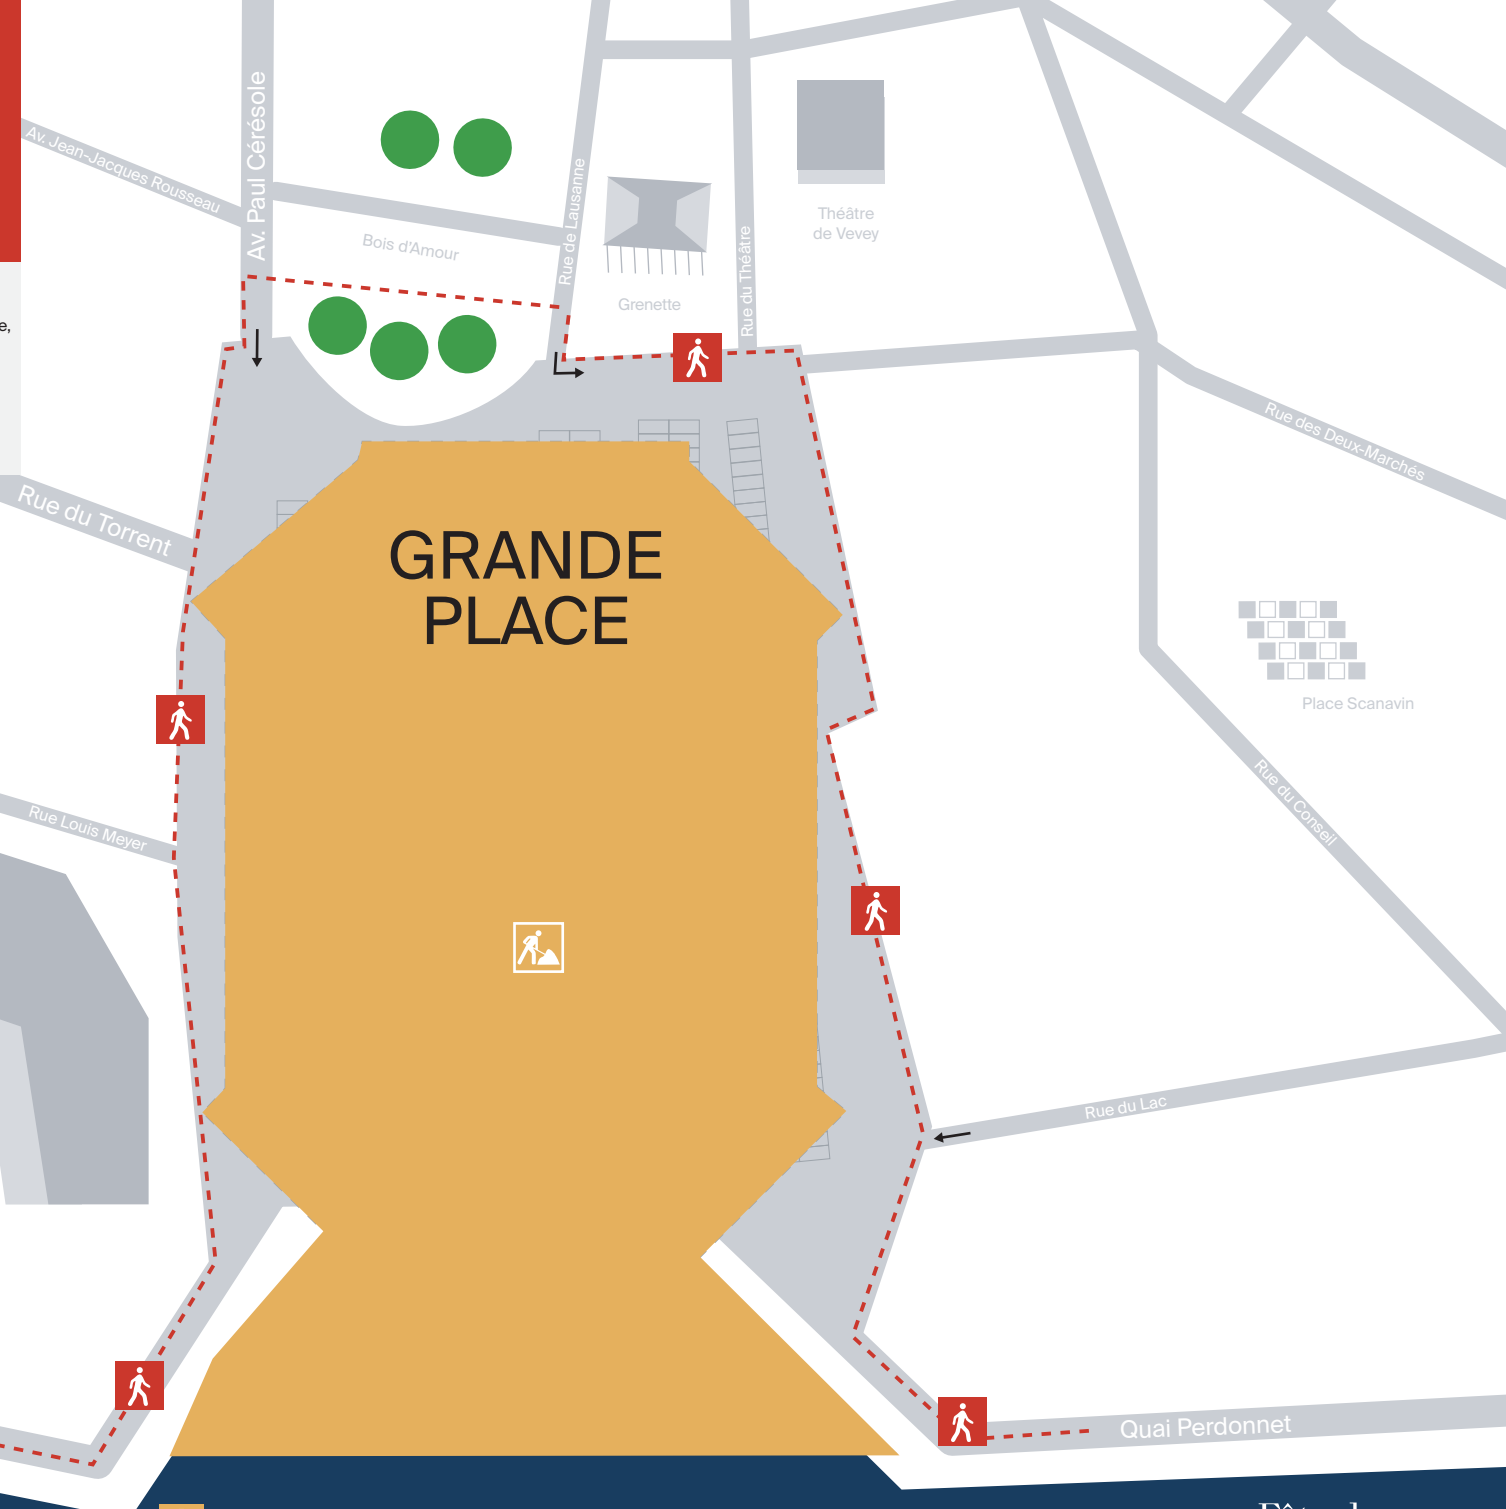

Lac

PHASE 8 Montage arène

du 4 mars au 14 juillet 2019
95 jours ouvrables

P Indisponible


P Indisponible

95 jours ouvrables
Fin du montage des gradins,
des éléments scéniques et des
Terrasses de la Confrérie.

Zones arène & plateforme
Travaux et installations

8 phases
Montage arène (9 mois)

oct	nov	déc	jan	fév	mar	avr	mai	juin	juil
					8				

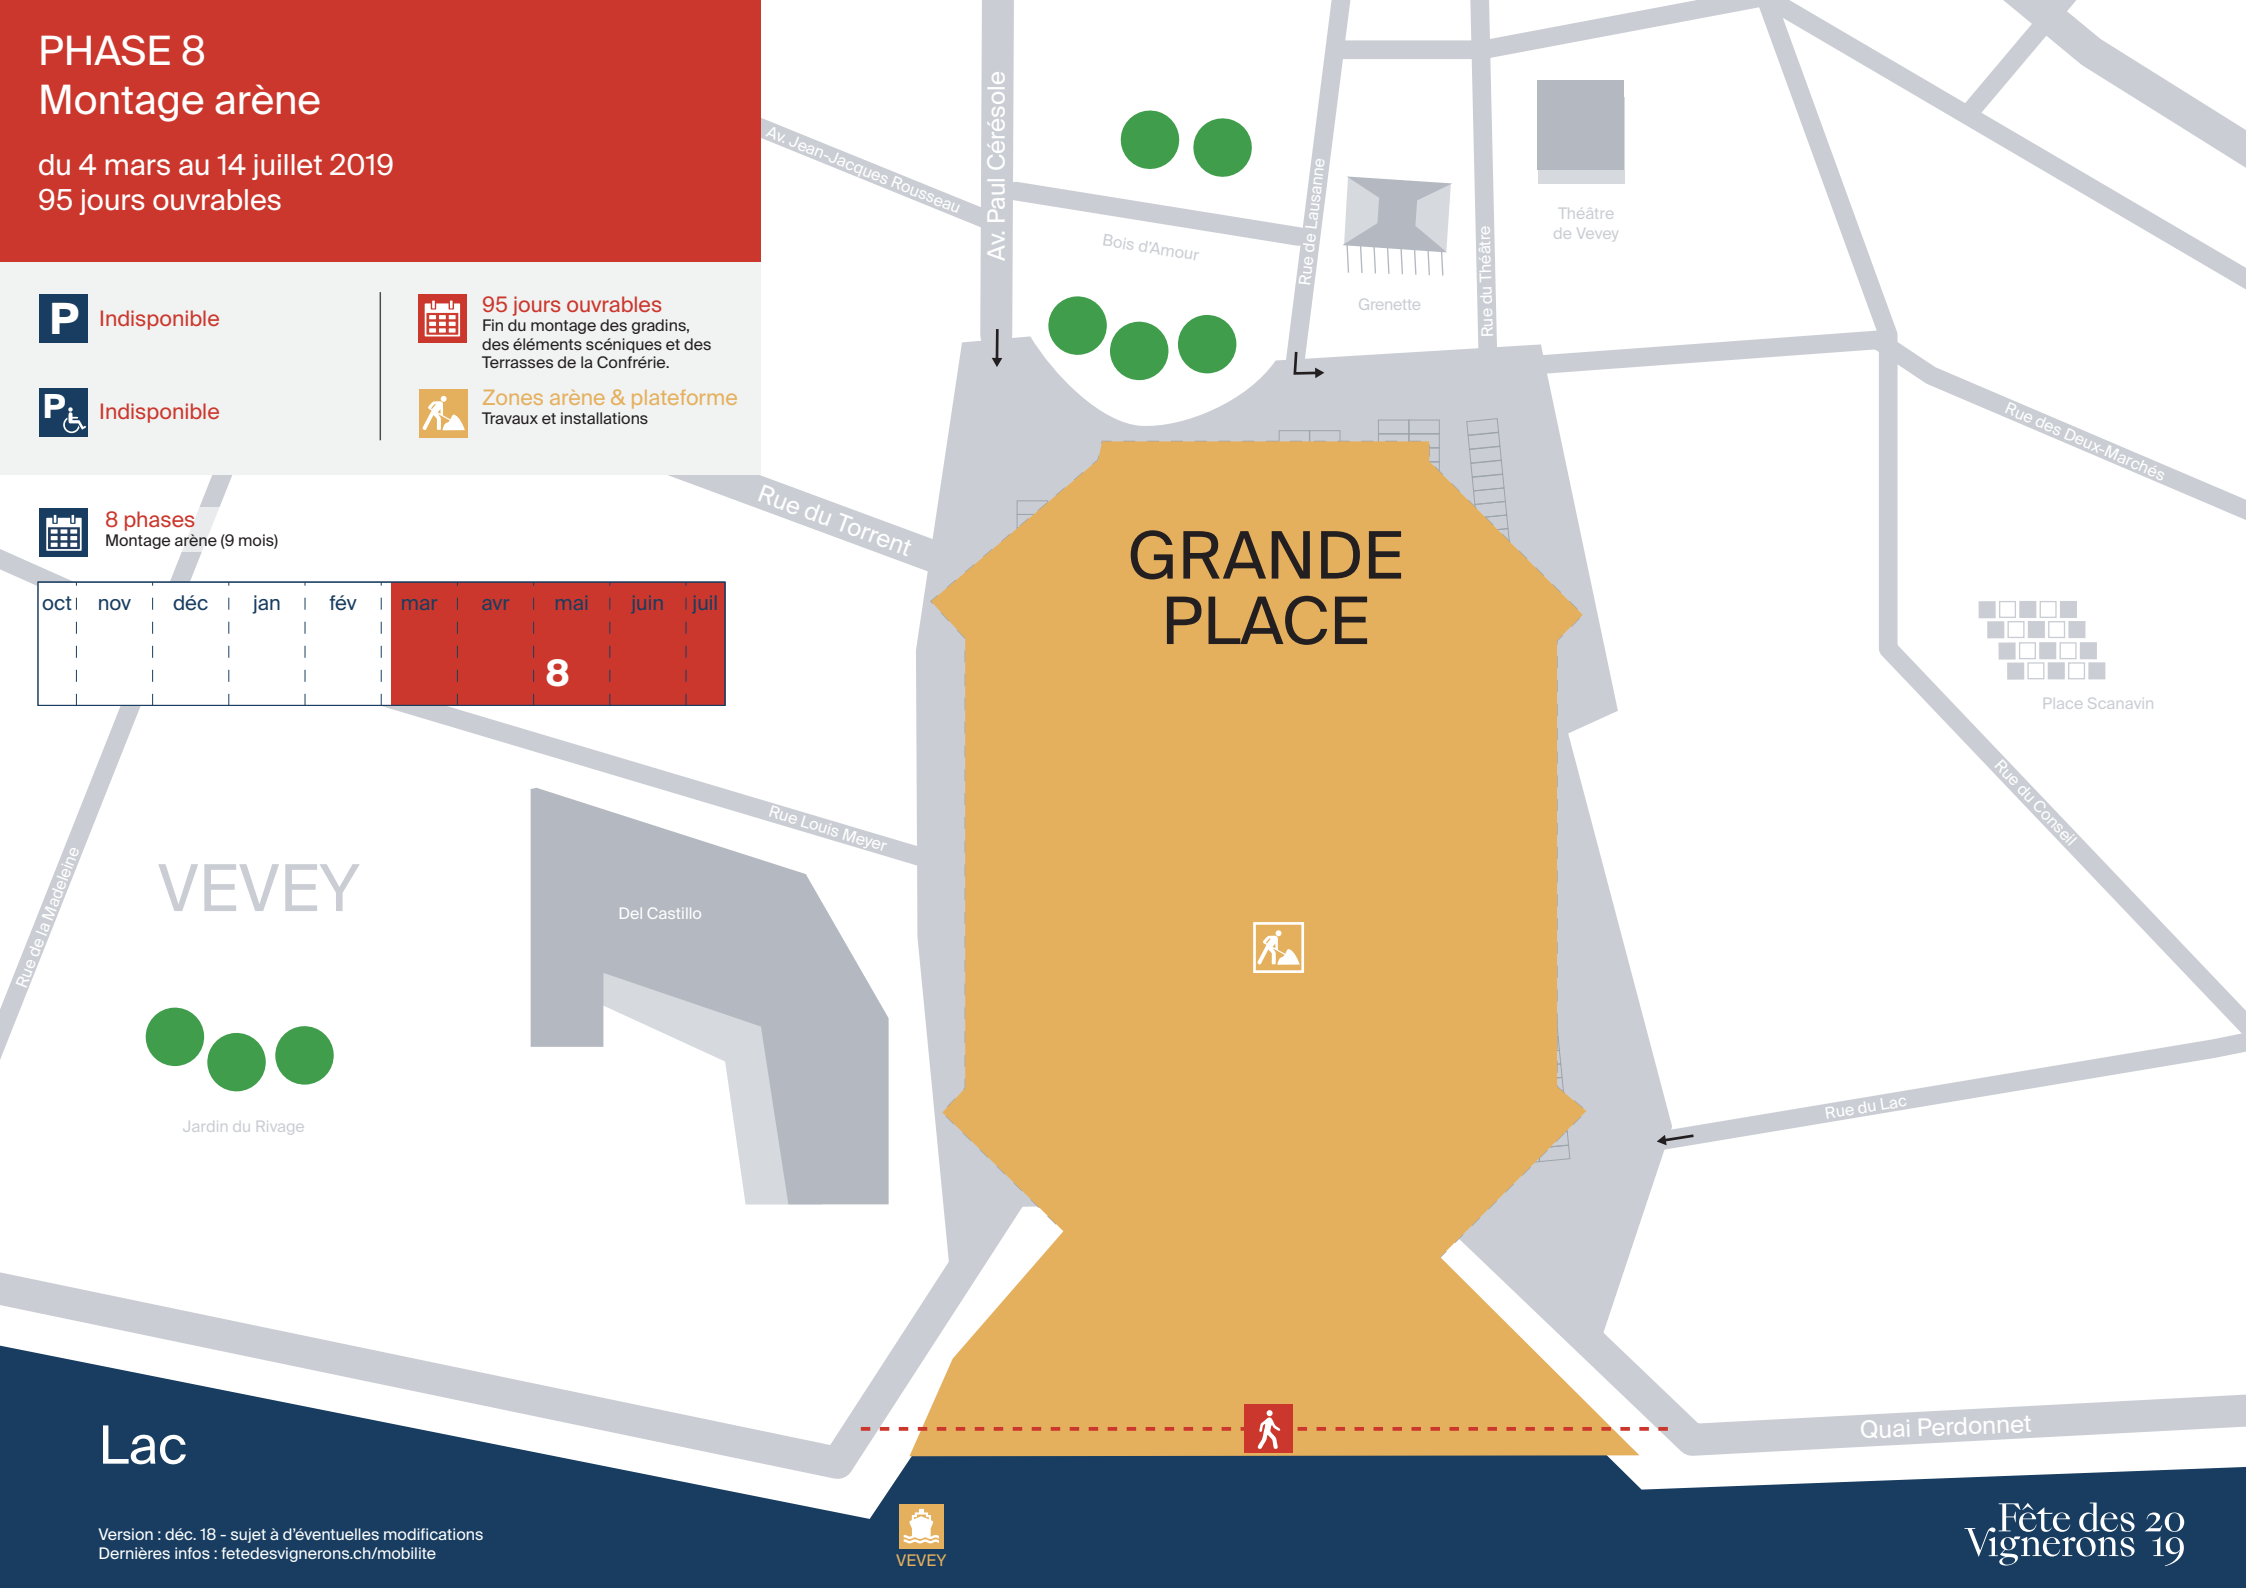

Lac
