



Séance d'information – 10 octobre 2018
Mobilité chantier, Fête des Vignerons 2019

Ordre du jour

Organisation de la soirée et présentation – J.-M. Rudaz

Bienvenue – E. Leimgruber

Présentation de la Fête des Vignerons – F. Hohl

Phasage du chantier de l'arène – D. Willi

Mobilité, circulation et stationnement – P. Katz

Outils de l'information – M.-J. Valente

Mesures d'accompagnement – E. Leimgruber

Marché de Vevey – E. Rivier

Conclusion et questions – J.-M. Rudaz

An aerial, grayscale photograph of a city grid, likely Vevey, Switzerland, showing a dense pattern of buildings and streets. The image is semi-transparent, allowing text to be overlaid.

Bienvenue

E. Leimgruber, Syndique



Fête des Vignerons 1999, photo Groupement des photographes veveysans, © Confrérie des Vignerons

La Fête des Vignerons 2019

Frédéric Hohl, Directeur Exécutif

- Montage des structures
- Répétitions
- Exploitation
- Démontage

Montage des structures

Du 15 octobre 2018
à mi-mai 2019



L'arène FeVi2019

Répétitions

- La Veyre – de novembre 2018 au 19 mai 2019
- Dans l'arène - du 20 mai au 16 juillet 2019



Les Terrasses de la Confrérie

Exploitation

La phase « Exploitation » sera développée de manière ultérieure.

Habitants et commerçants seront continuellement tenus informés via

www.fetedesvignerons.ch/mobilite



L'arène FeVi2019

Démontage

La phase de démontage sera développée de manière ultérieure.

Habitants et commerçants seront continuellement tenus informés via :

www.fetedesvignerons.ch/mobilite




L'arène FeVi2019



Phasage du chantier de l'arène

D. Willi, Fête des Vignerons

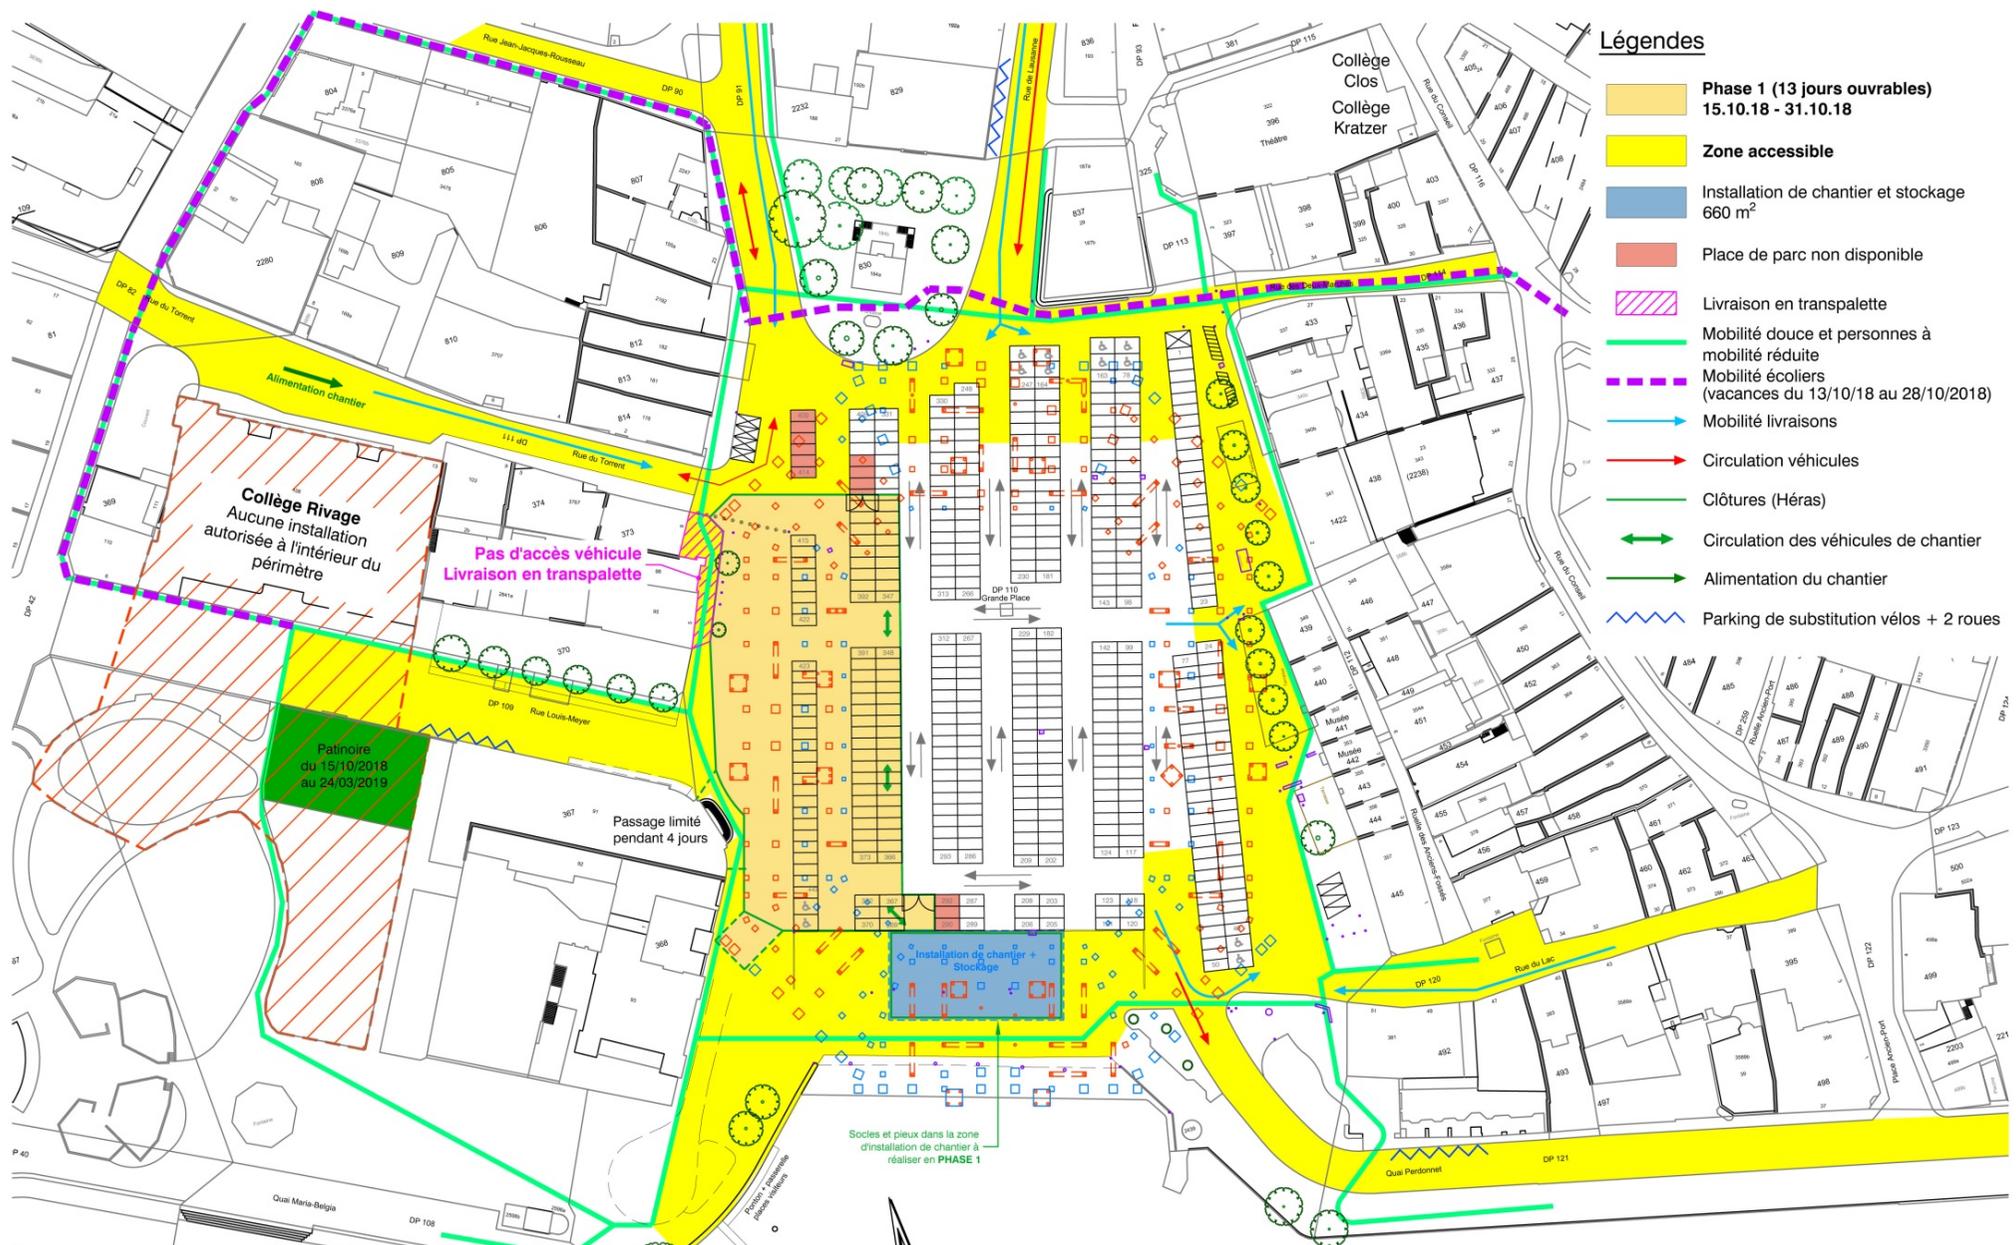


Légendes

- Phase 1 (13 jours ouvrables)**
15.10.18 - 31.10.18
- Zone accessible**
- Installation de chantier et stockage
660 m²
- Place de parc non disponible
- Livraison en transpalette
- Mobilité douce et personnes à mobilité réduite
- Mobilité écolecteurs (vacances du 13/10/18 au 28/10/2018)
- Mobilité livraisons
- Circulation véhicules
- Clôtures (Héras)
- Circulation des véhicules de chantier
- Alimentation du chantier
- Parking de substitution vélos + 2 roues

Phase 1 / 352 places
342 + 10 (handicapés)
15.10.18 au 31.10.18

Socles enterrés = 176 pièces Pieux (selon KF SA) = 157 pièces Socles hors-sol = 130 pièces

	Av. des Alpes 43 - 1820 Montreux Tél. +41 21 333 45 00	FETE DES VIGNERONS 2019 Commune de Vevey	Date 06.10.2018 Dessin DF Contrôle FT	<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> N° PLAN 4500-201 PHASE 1 </div>
	Av. du 14 Avril 20 - 1020 Remens Tél. +41 21 333 48 30	PHASAGE DES TRAVAUX & MOBILITÉ	Format A3 Echelle 1/1000	
	info@dwhill.ch www.dwhill.ch			

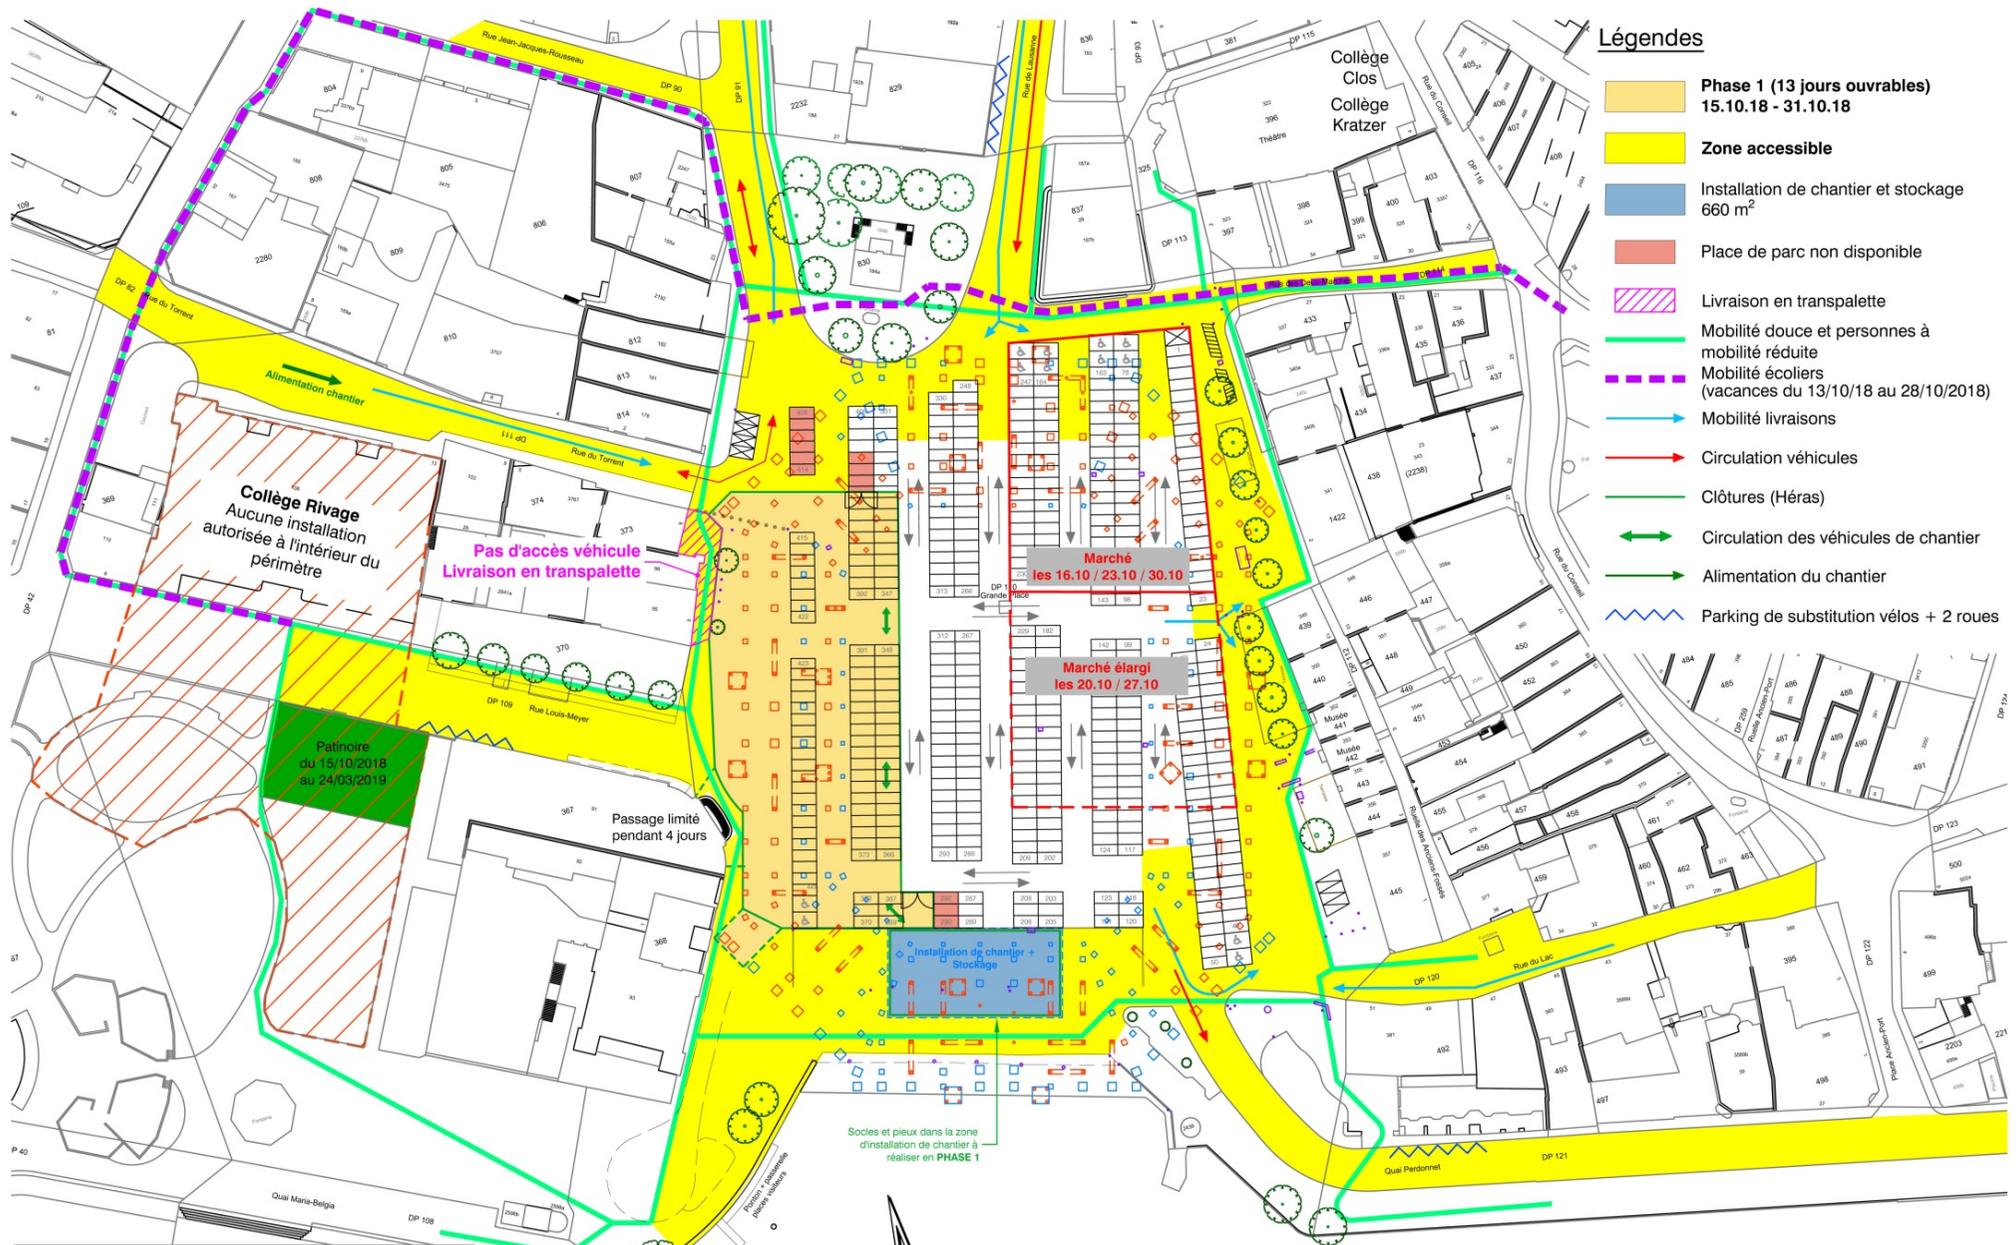


- ### Légendes
- Phase 1 (13 jours ouvrables)
15.10.18 - 31.10.18
 - Zone accessible
 - Installation de chantier et stockage
660 m²
 - Place de parc non disponible
 - Livraison en transpalette
 - Mobilité douce et personnes à mobilité réduite
 - Mobilité écoliers (vacances du 13/10/18 au 28/10/2018)
 - Mobilité livraisons
 - Circulation véhicules
 - Clôtures (Héras)
 - Circulation des véhicules de chantier
 - Alimentation du chantier
 - Parking de substitution vélos + 2 roues

MARCHE DE VEVEY (Dates et emprises)

Socles enterrés = 176 pièces Pieux (selon KF SA) = 157 pièces Socles hors-sol = 130 pièces

	Av. des Alpes 43 - 1820 Montreux Tél: +41 21 333 43 00	FETE DES VIGNERONS 2019 Commune de Vevey	Date 08.10.2018 Dessin DF Contrôle FT	N° PLAN 4500-201.1
	Av. du 14 Avril 20 - 1020 Ranseren Tél: +41 21 333 48 30	PHASAGE DES TRAVAUX & MOBILITÉ	Format A3 Echelle 1/1000	
	info@dwilli.ch www.dwilli.ch			
			PHASE 1 - MARCHÉ DE VEVEY	

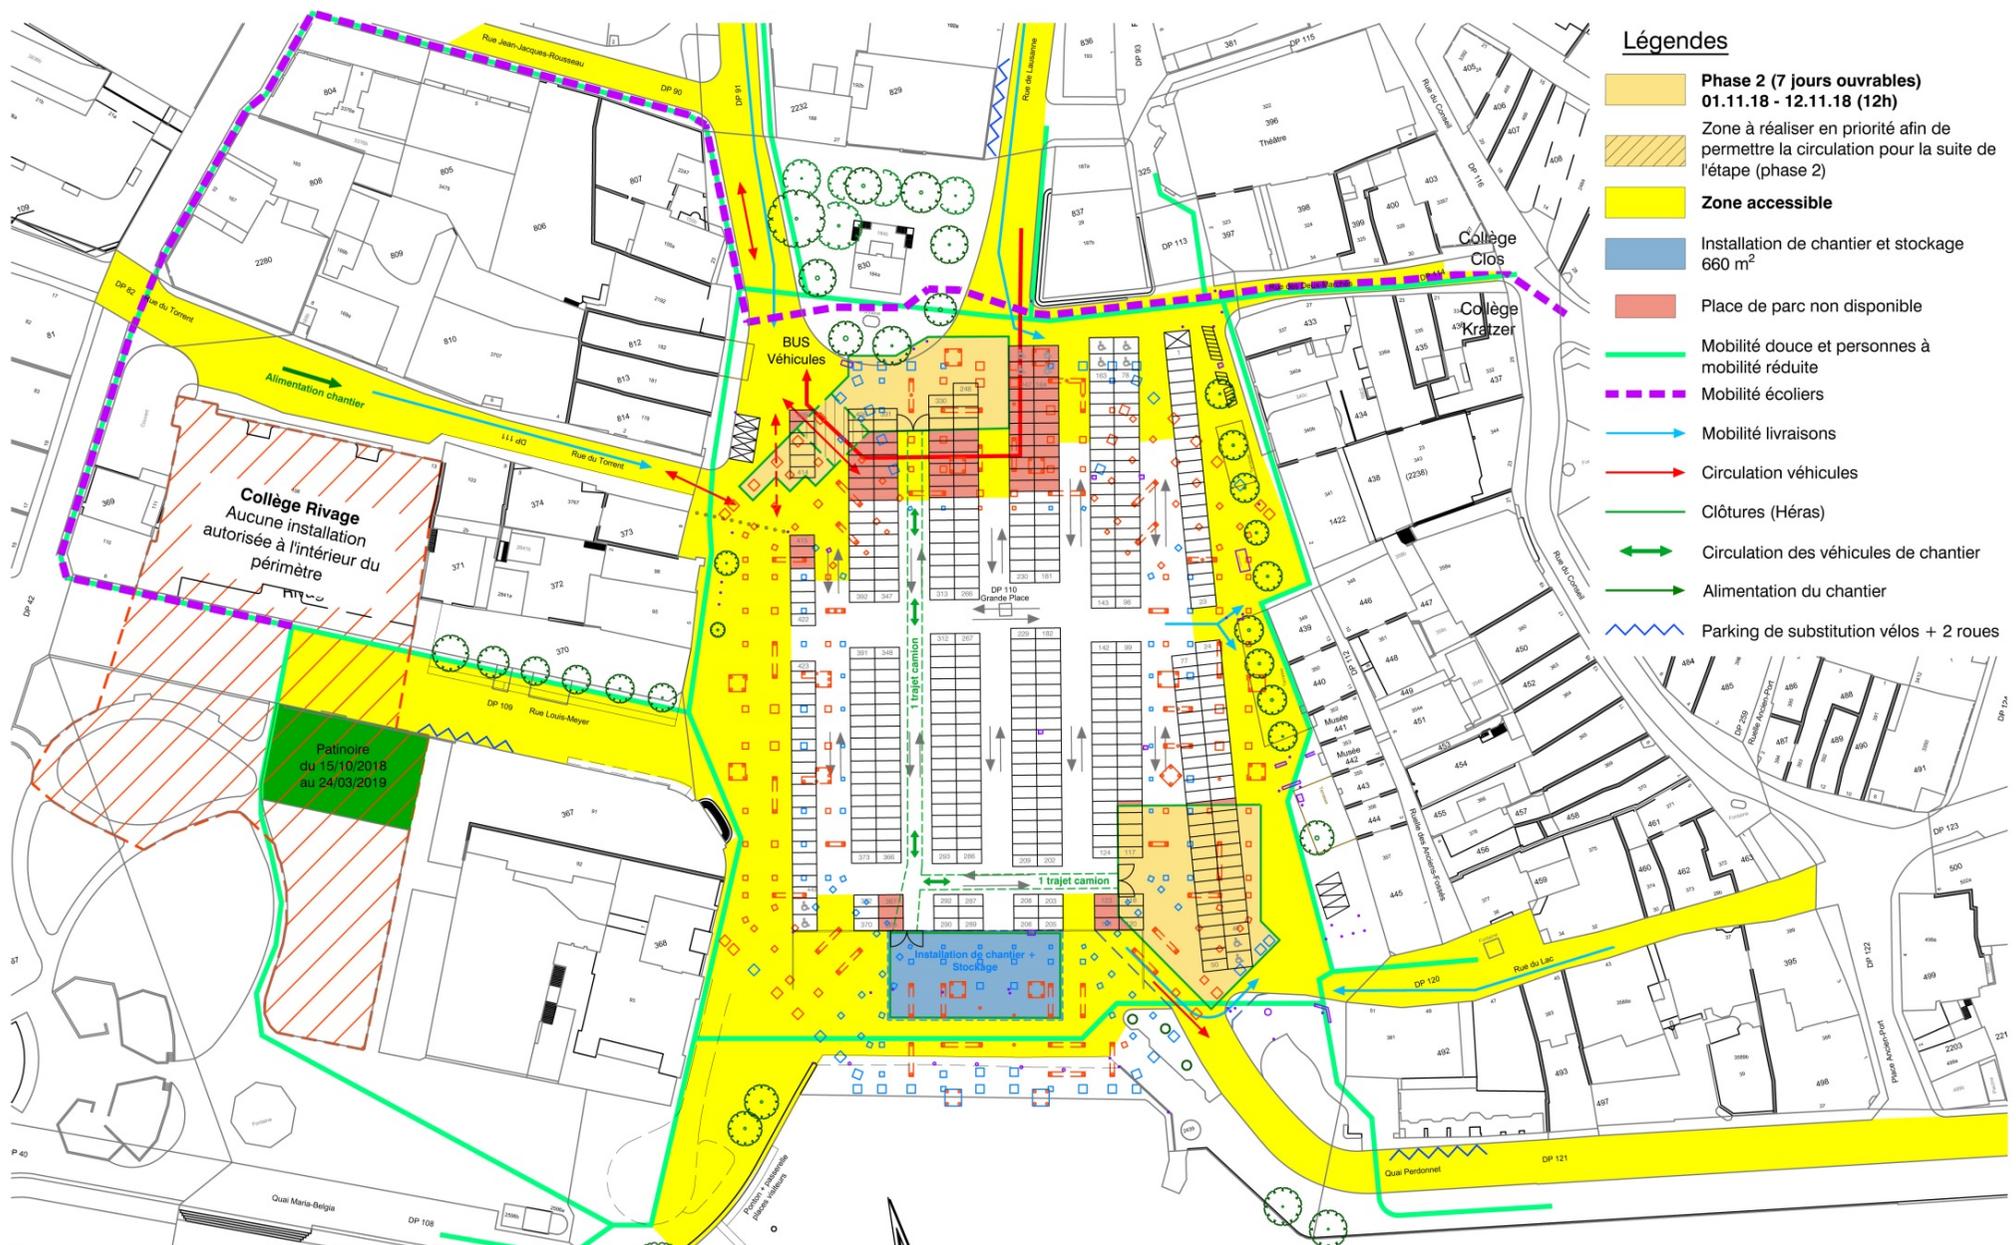

- ### Légendes
- Phase 2 (7 jours ouvrables)
01.11.18 - 12.11.18 (12h)
 - Zone à réaliser en priorité afin de permettre la circulation pour la suite de l'étape (phase 2)
 - Zone accessible
 - Installation de chantier et stockage
660 m²
 - Place de parc non disponible
 - Mobilité douce et personnes à mobilité réduite
 - Mobilité écoliers
 - Mobilité livraisons
 - Circulation véhicules
 - Clôtures (Héras)
 - Circulation des véhicules de chantier
 - Alimentation du chantier
 - Parking de substitution vélos + 2 roues


Phase 2 / 344 places
338 + 6 (handicapés)

01.11.18 au 12.11.18
(y compris repli Saint-Martin)



Socles enterrés = 176 pièces Pieux (selon KF SA) = 157 pièces Socles hors-sol = 130 pièces

	Av. des Alpes 43 - 1820 Montreux Tél. +41 21 333 45 00	FETE DES VIGNERONS 2019 Commune de Vevey	Date 06.10.2018 Dessin DF Contrôle FT	N° PLAN 4500-202
	Av. du 14 Avril 20 - 1020 Renens Tél. +41 21 333 48 30 info@dwilli.ch www.dwilli.ch	PHASAGE DES TRAVAUX & MOBILITÉ	Format A3 Echelle 1/1000	

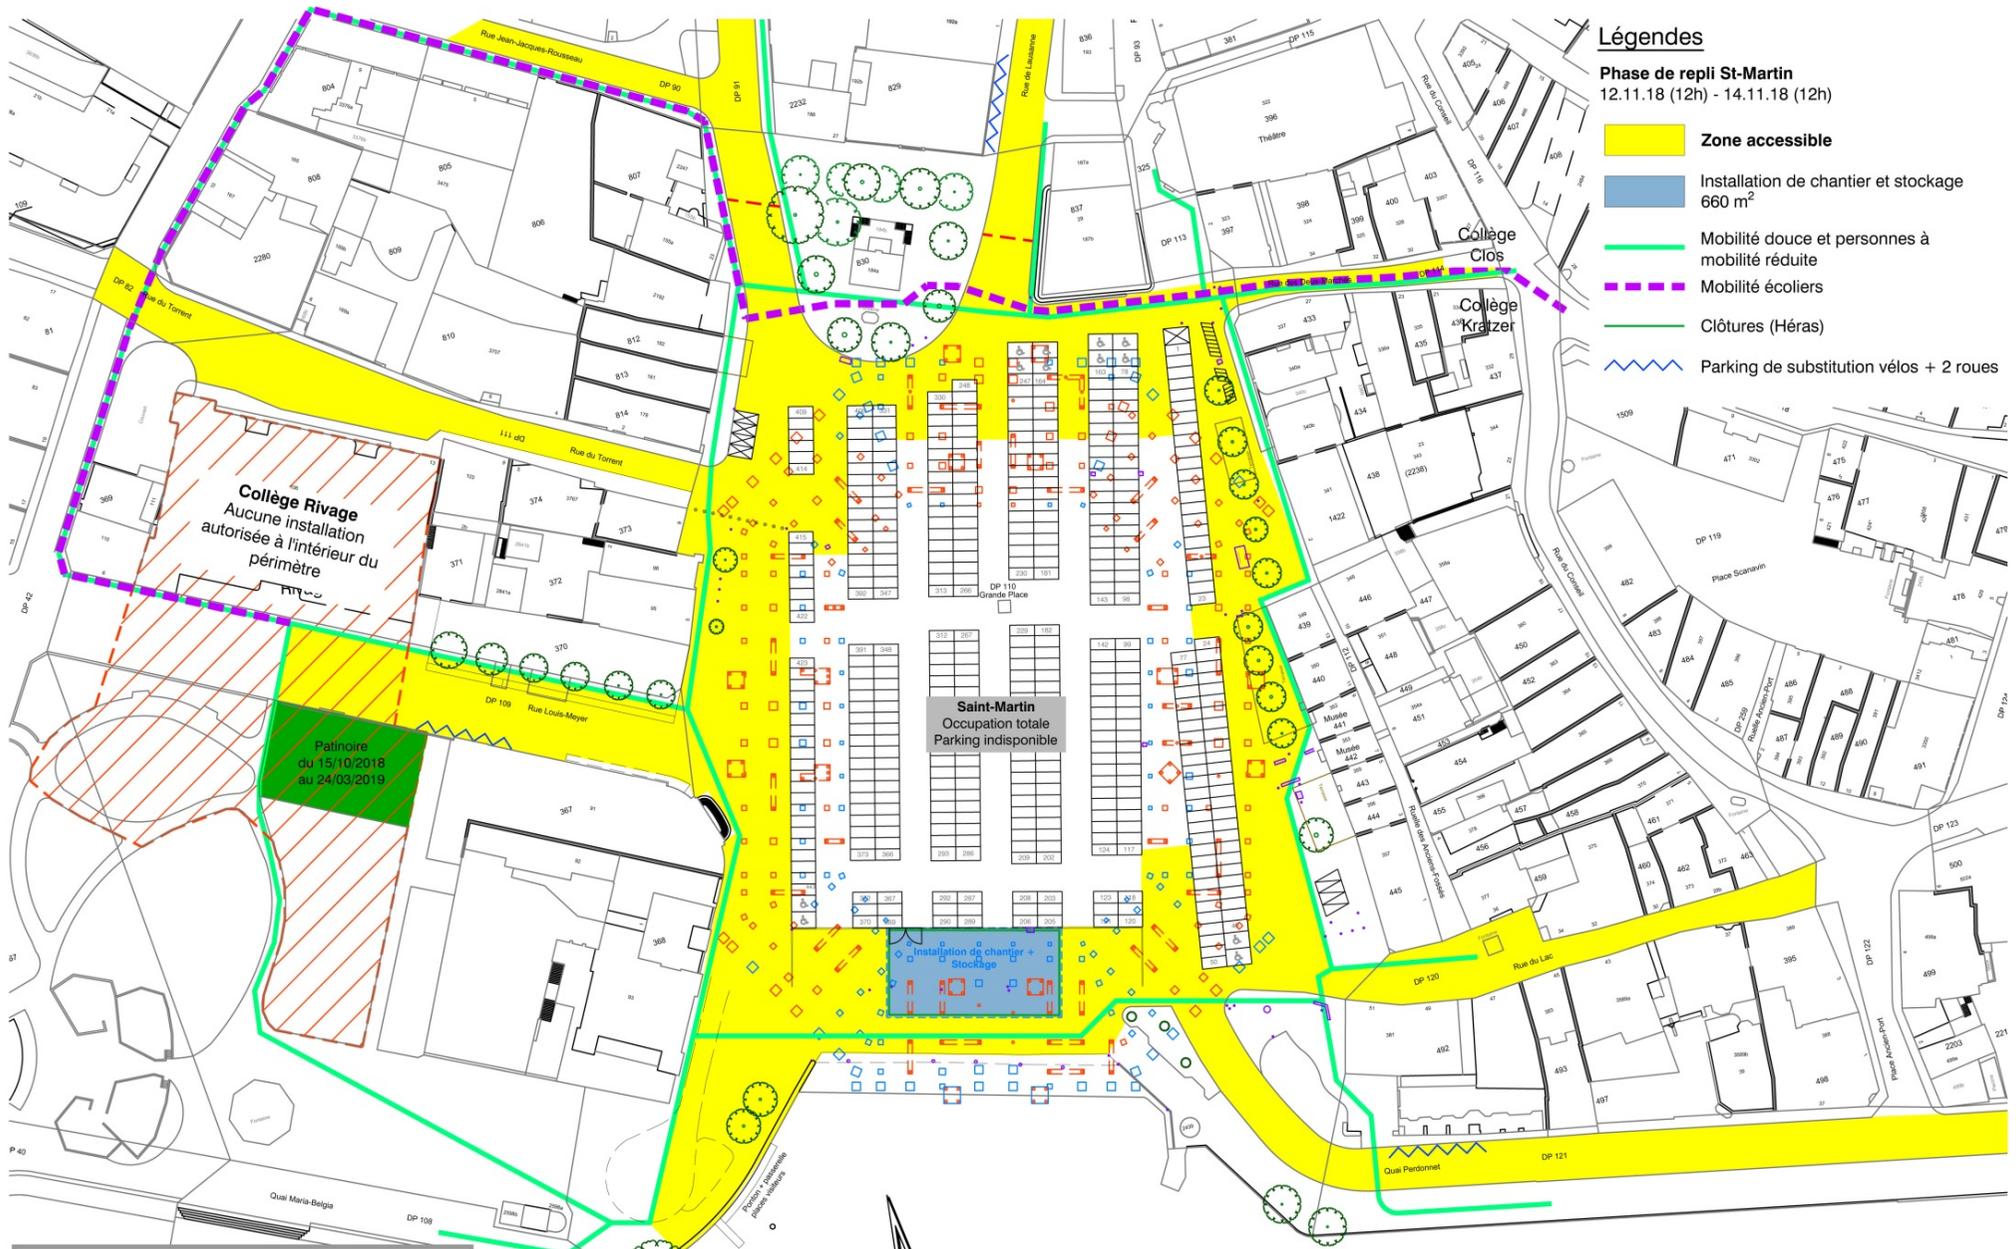

Légendes

Phase de repli St-Martin
12.11.18 (12h) - 14.11.18 (12h)

- Zone accessible
- Installation de chantier et stockage 660 m²
- Mobilité douce et personnes à mobilité réduite
- Mobilité écoliers
- Clôtures (Héras)
- Parking de substitution vélos + 2 roues

Phase 3 / SAINT MARTIN

Lundi 12.11.18 (dès 12 h)
Mercredi 14.11.18 (12 h)

Socles enterrés = 176 pièces

Pieux (selon KF SA) = 157 pièces

Socles hors-sol = 130 pièces




 Av. des Alpes 43 - 1820 Montreux
 Tél. +41 21 333 40 00
 Av. du 14 Avril 20 - 1020 Renens
 Tél. +41 21 333 40 30
 info@dwll.ch
 www.dwll.ch

FETE DES VIGNERONS 2019
 Commune de Vevey
PHASAGE DES TRAVAUX & MOBILITÉ

Date **08.10.2018**
 Dessin DF
 Contrôle FT
 Format A3
 Echelle 1/1000

N° PLAN
4500-203
 PHASE 3

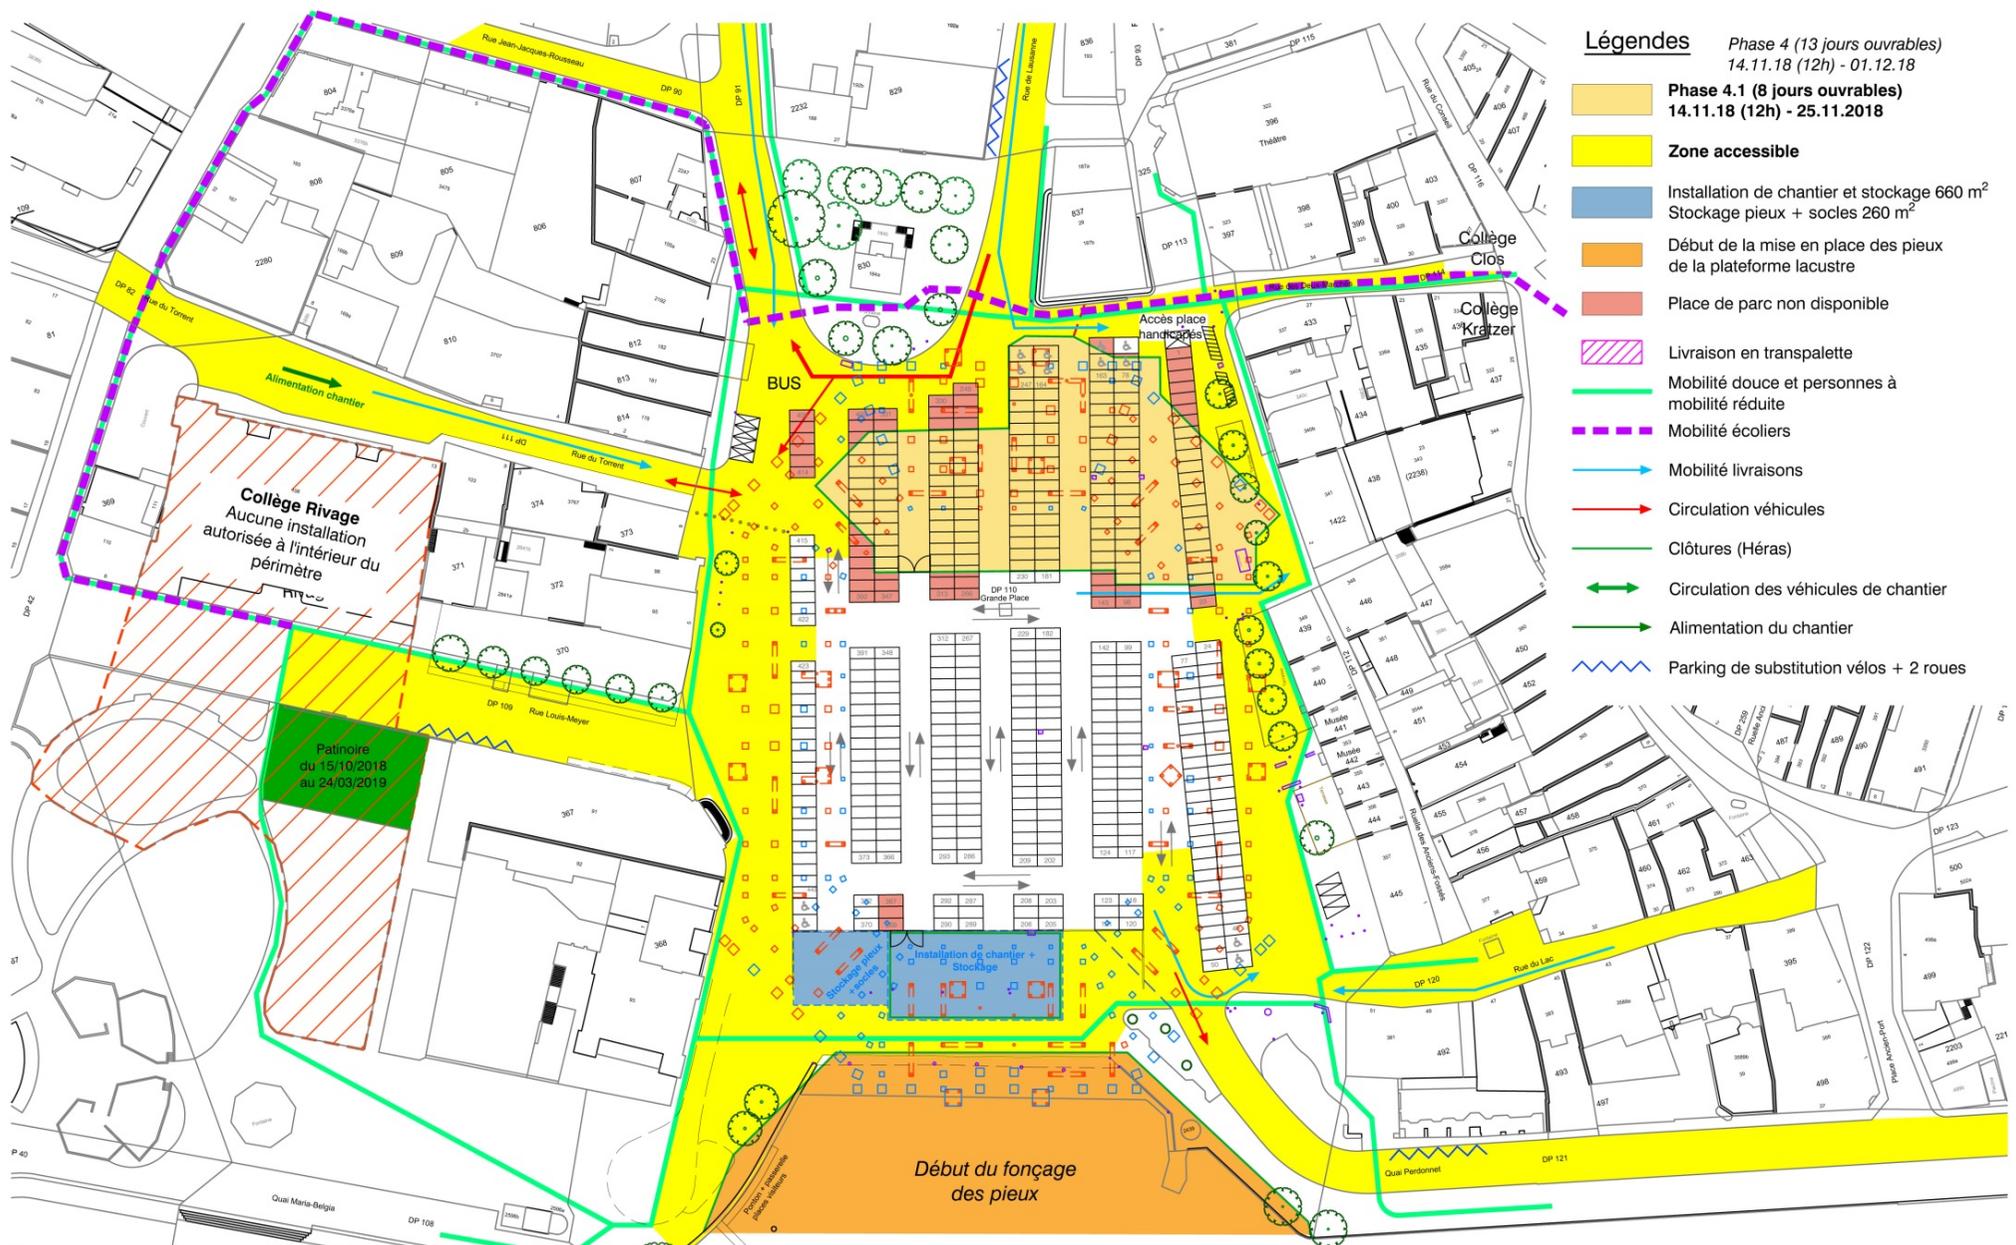


- Légendes**
- Phase 4 (13 jours ouvrables)
14.11.18 (12h) - 01.12.18
 - Phase 4.1 (8 jours ouvrables)
14.11.18 (12h) - 25.11.2018
 - Zone accessible
 - Installation de chantier et stockage 660 m²
Stockage pieux + socles 260 m²
 - Début de la mise en place des pieux
de la plateforme lacustre
 - Place de parc non disponible
 - Livraison en transpalette
 - Mobilité douce et personnes à
mobilité réduite
 - Mobilité écoliers
 - Mobilité livraisons
 - Circulation véhicules
 - Clôtures (Héras)
 - Circulation des véhicules de chantier
 - Alimentation du chantier
 - Parking de substitution vélos + 2 roues

Phase 4.1 / 269 places
264 + 5 (handicapés)
14.11.18 (12h) au 25.11.18

Socles enterrés = 176 pièces Pieux (selon KF SA) = 157 pièces Socles hors-sol = 130 pièces

	Av. des Alpes 43 - 1820 Montreux Tél. +41 21 333 45 00	FETE DES VIGNERONS 2019 Commune de Vevey	Date 05.10.2018 Dessin DF Contrôle FT	N° PLAN 4500-204.1 PHASE 4.1
	Av. du 14 Avril 20 - 1020 Renens Tél. +41 21 333 48 30	PHASAGE DES TRAVAUX & MOBILITÉ	Format A3 Echelle 1/1000	
	info@dwillis.ch www.dwillis.ch			

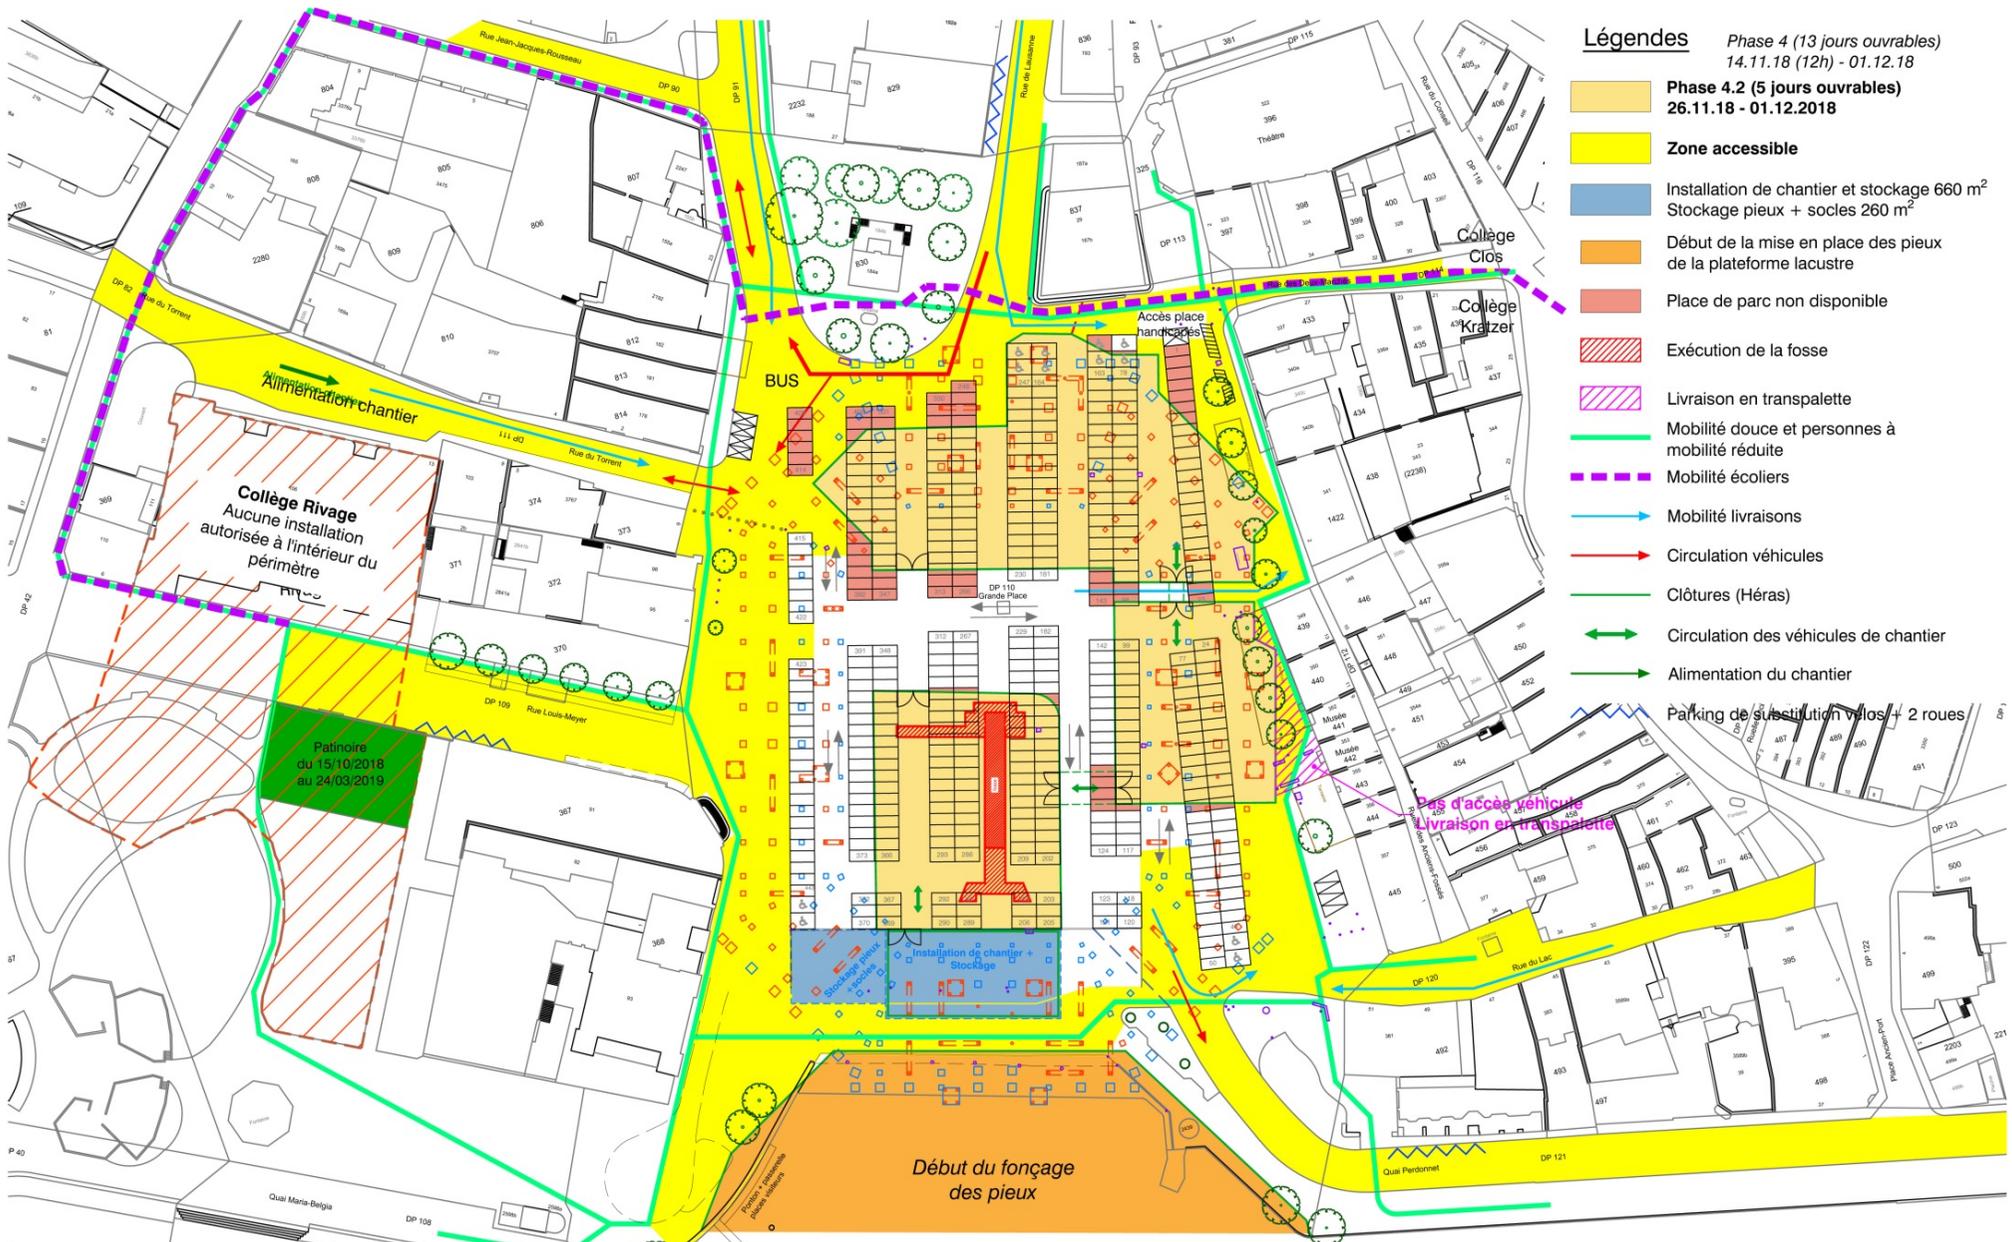

- Légendes** Phase 4 (13 jours ouvrables)
14.11.18 (12h) - 01.12.18
- Phase 4.2 (5 jours ouvrables)
26.11.18 - 01.12.2018
 - Zone accessible
 - Installation de chantier et stockage 660 m²
Stockage pieux + socles 260 m²
 - Début de la mise en place des pieux de la plateforme lacustre
 - Place de parc non disponible
 - Exécution de la fosse
 - Livraison en transpalette
 - Mobilité douce et personnes à mobilité réduite
 - Mobilité écoliers
 - Mobilité livraisons
 - Circulation véhicules
 - Clôtures (Héras)
 - Circulation des véhicules de chantier
 - Alimentation du chantier
 - Parking de substitution vélos / 2 roues

Phase 4.2 / 134 places
129 + 5 (handicapés)
26.11.18 au 01.12.18

Socles enterrés = 176 pièces Pieux (selon KF SA) = 157 pièces Socles hors-sol = 130 pièces

dw
Daniel W. Willi
Ingenieur-Planer

Av. des Alpes 43 - 1820 Montreux
Tél. +41 21 333 45 00

Av. du 14 Avril 20 - 1020 Remens
Tél. +41 21 333 48 30


info@dwilli.ch
www.dwilli.ch

FETE DES VIGNERONS 2019
Commune de Vevey

PHASAGE DES TRAVAUX & MOBILITÉ

Date	05.10.2018
Dessin	DF
Contrôle	FT
Format	A3
Echelle	1/1000

N° PLAN	4500-204.2
PHASE 4.2	

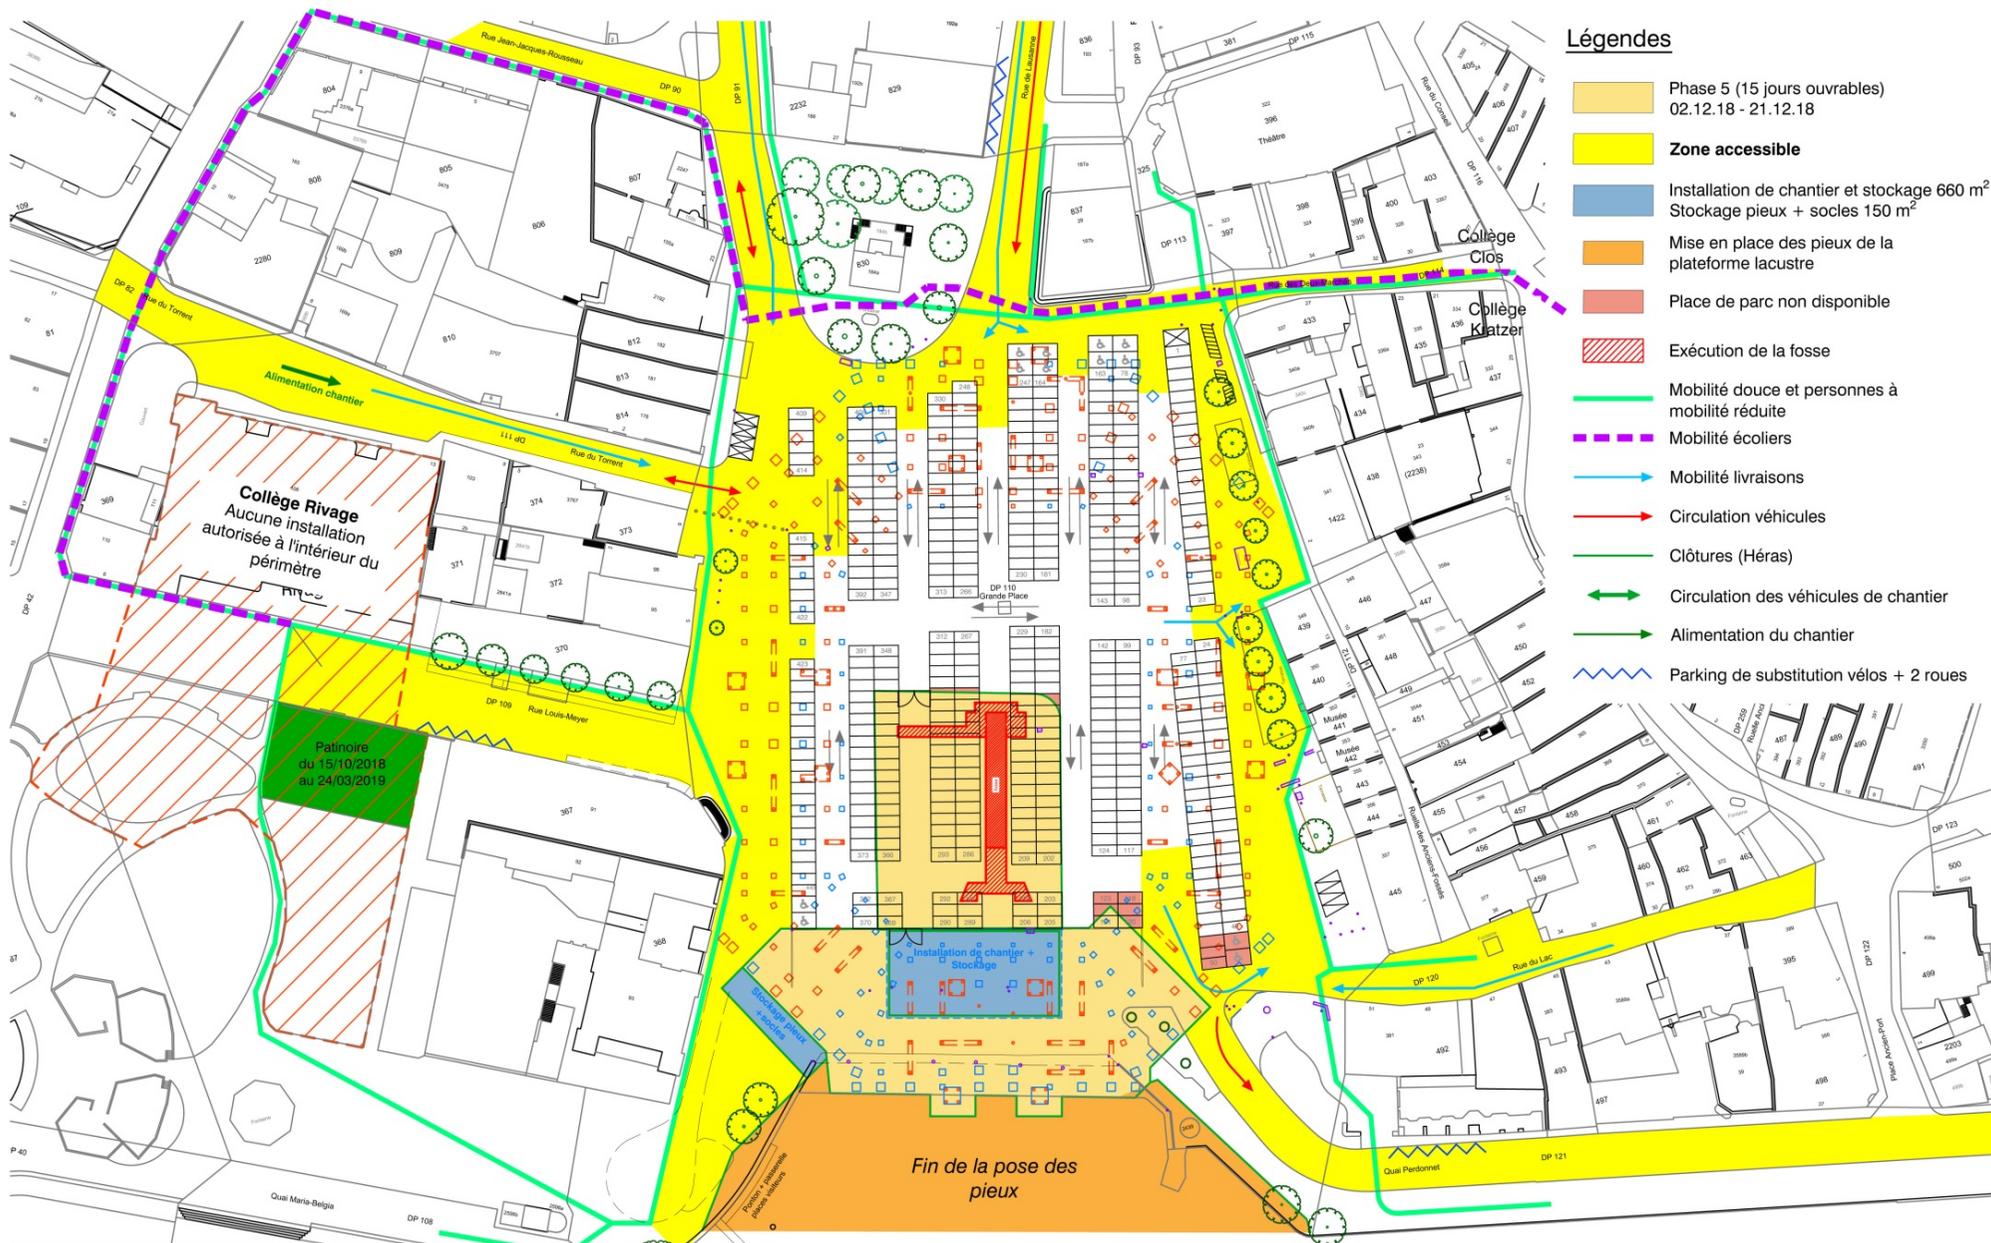

Légendes

- Phase 5 (15 jours ouvrables)
02.12.18 - 21.12.18
- Zone accessible
- Installation de chantier et stockage 660 m²
Stockage pieux + socles 150 m²
- Mise en place des pieux de la plateforme lacustre
- Place de parc non disponible
- Exécution de la fosse
- Mobilité douce et personnes à mobilité réduite
- Mobilité écoliers
- Mobilité livraisons
- Circulation véhicules
- Clôtures (Héras)
- Circulation des véhicules de chantier
- Alimentation du chantier
- Parking de substitution vélos + 2 roues

Phase 5 / 346 places

336 + 10 (handicapés)

02.12.18 au 21.12.18

Lac Léman
DP 9009

Socles enterrés = 176 pièces

Pieux (selon KF SA) = 157 pièces

Socles hors-sol = 130 pièces

dw
danielwilli
Architecte

Av. des Alpes 43 - 1820 Montreux
Tél. +41 21 333 45 00


Av. du 14 Avril 20 - 1020 Remens
Tél. +41 21 333 48 30

info@dwilli.ch
www.dwilli.ch

FETE DES VIGNERONS 2019
Commune de Vevey
PHASAGE DES TRAVAUX & MOBILITÉ

Date **05.10.2018**
Dessin DF
Contrôle FT
Format A3
Echelle 1/1000

N° PLAN
4500-205
PHASE 5

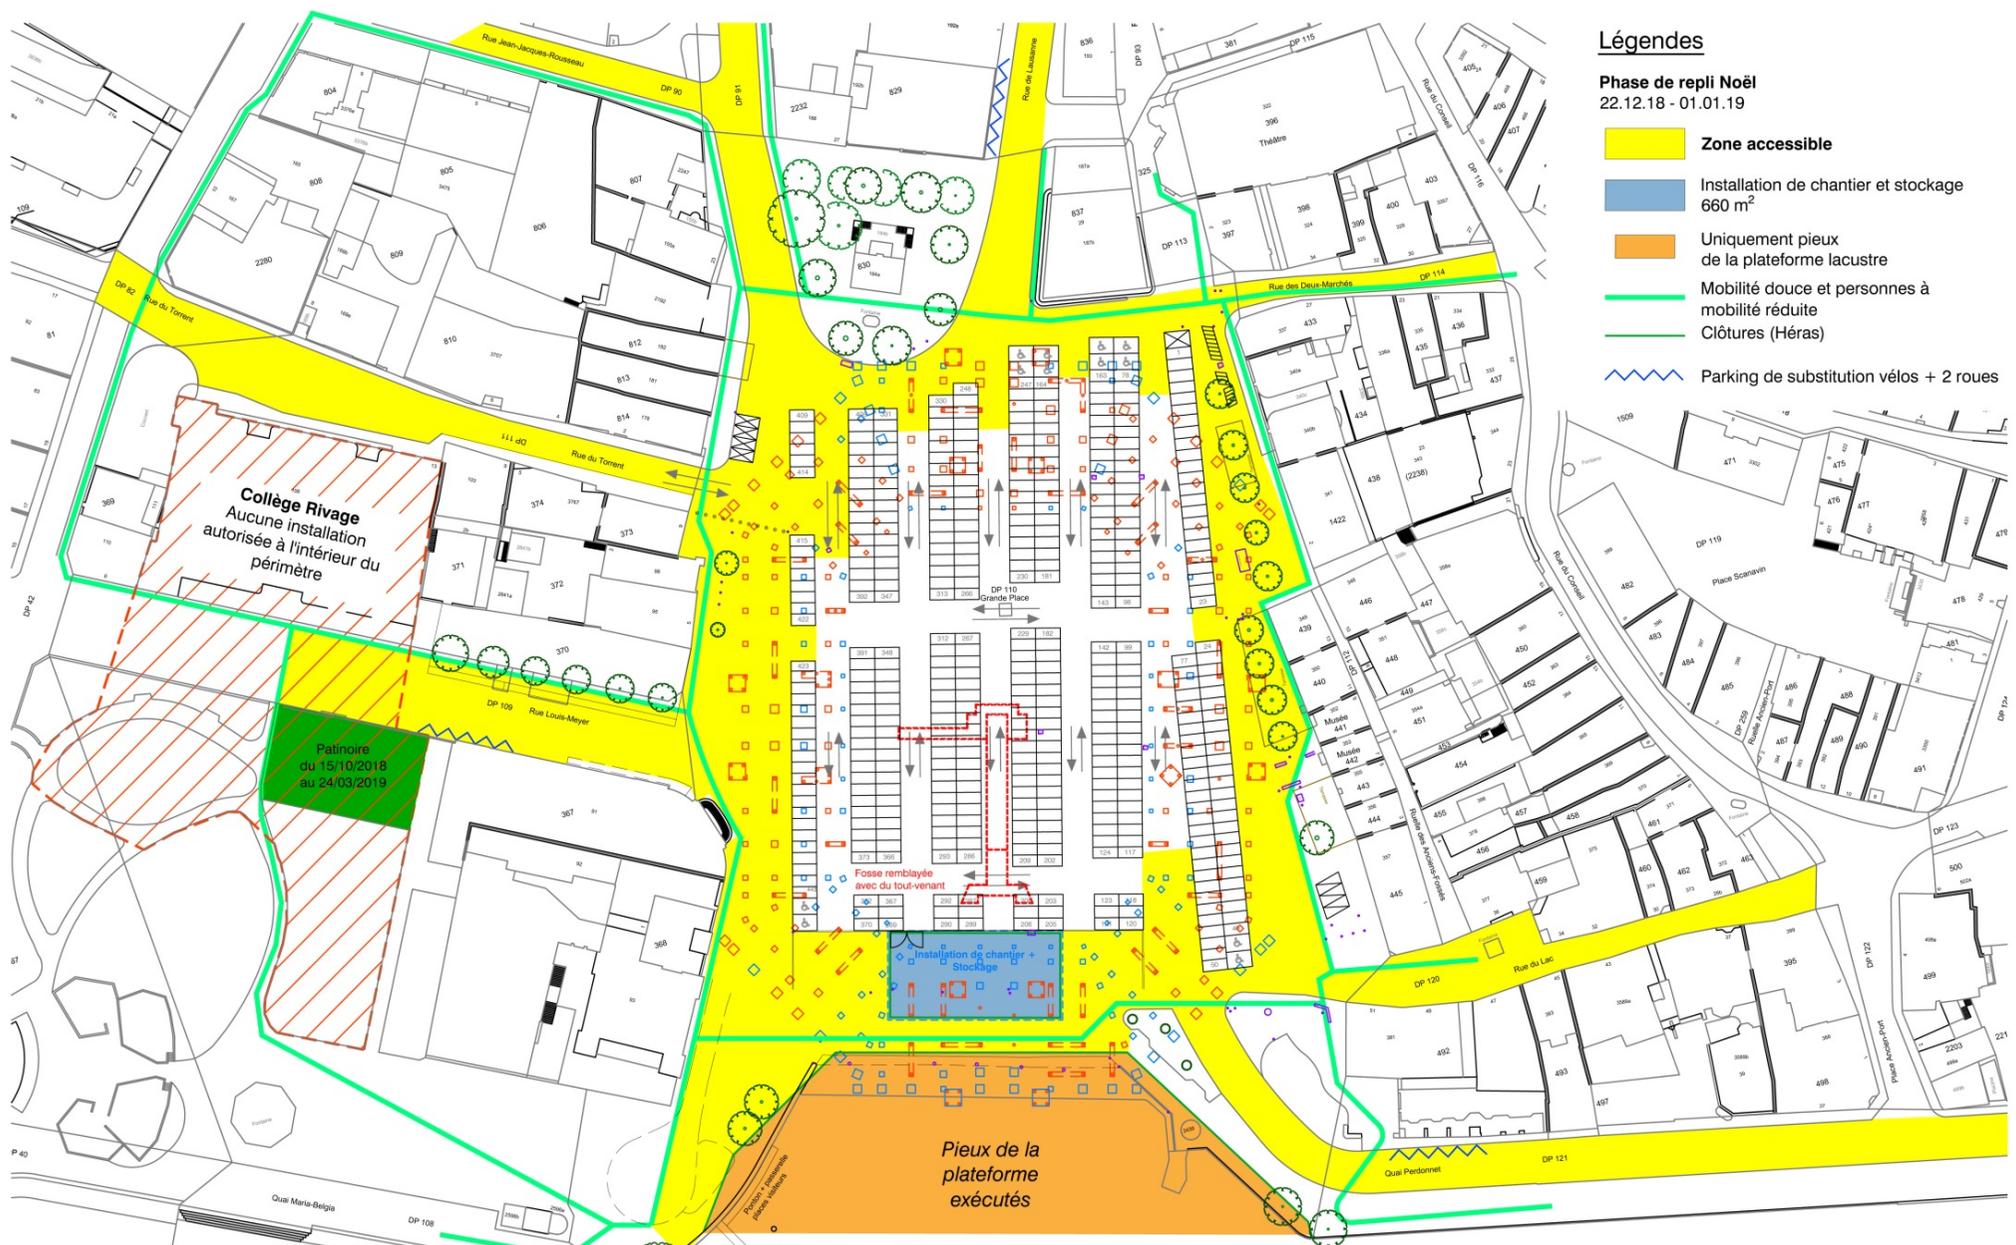

Légendes

Phase de repli Noël
22.12.18 - 01.01.19

- Zone accessible
- Installation de chantier et stockage
660 m²
- Uniquement pieux
de la plateforme lacustre
- Mobilité douce et personnes à
mobilité réduite
- Clôtures (Héras)
- Parking de substitution vélos + 2 roues

Phase 6 / NOËL
443 + 12 (handicapés) - 455 PLACES
22.12.18 au 01.01.19

Socles enterrés = 176 pièces

Pieux (selon KF SA) = 157 pièces

Socles hors-sol = 130 pièces


 Av. des Alpes 43 - 1820 Montreux
Tél. +41 21 333 45 00
Av. du 14 Avril 20 - 1020 Renens
Tél. +41 21 333 48 30
info@dwillis.ch
www.dwillis.ch

FETE DES VIGNERONS 2019
Commune de Vevey
PHASAGE DES TRAVAUX & MOBILITÉ

Date 05.10.2018
Dessin DF
Contrôle FT
Format A3
Echelle 1/1000

N° PLAN
4500-206

PHASE 6

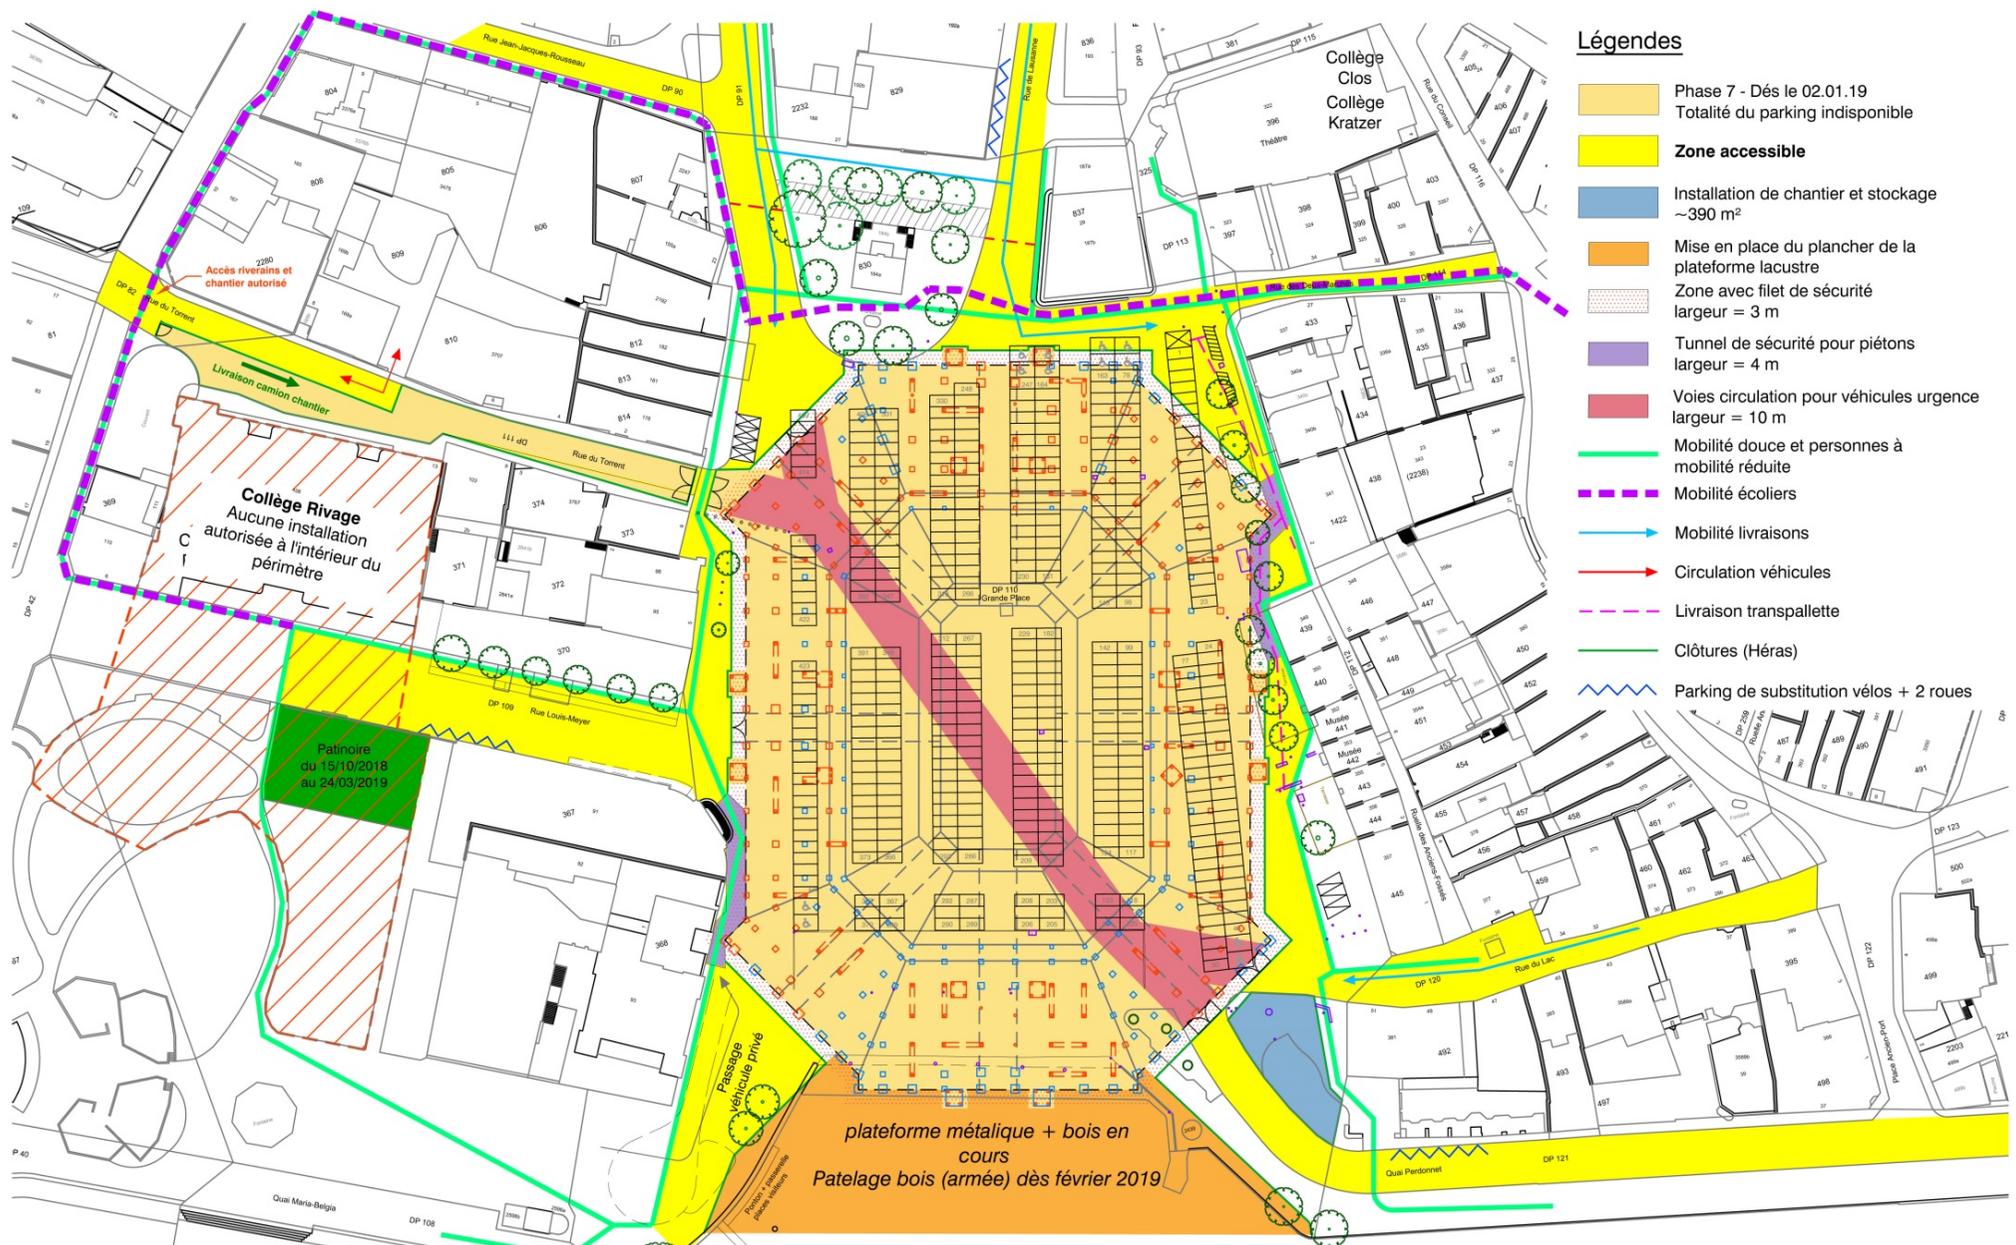

Légendes

- Phase 7 - Dès le 02.01.19
Totalité du parking indisponible
- Zone accessible**
- Installation de chantier et stockage
~390 m²
- Mise en place du plancher de la plateforme lacustre
- Zone avec filet de sécurité
largeur = 3 m
- Tunnel de sécurité pour piétons
largeur = 4 m
- Voies circulation pour véhicules urgence
largeur = 10 m
- Mobilité douce et personnes à mobilité réduite
- Mobilité écoliers
- Mobilité livraisons
- Circulation véhicules
- Livraison transpalette
- Clôtures (Héras)
- Parking de substitution vélos + 2 roues

Phase 7
Totalité du parking indisponible


Dès le 02.01.2019

plateforme métallique + bois en cours
Patelage bois (armée) dès février 2019

Patinatoire
du 15/10/2018
au 24/03/2019

Socles enterrés = 176 pièces Pieux (selon KF SA) = 157 pièces Socles hors-sol = 130 pièces

	Av. des Alpes 43 - 1820 Montreux Tél. +41 21 333 45 00	FETE DES VIGNERONS 2019 Commune de Vevey PHASAGE DES TRAVAUX & MOBILITÉ	Date 05.10.2018	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">N° PLAN</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4500-207</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">PHASE 7</td> </tr> </table>	N° PLAN	4500-207	PHASE 7
	N° PLAN						
	4500-207						
	PHASE 7						
Av. du 14 Avril 20 - 1020 Remens Tél. +41 21 333 48 30	Dessin						
info@dwilli.ch www.dwilli.ch	Contrôle FT						
	Echelle 1/1000						

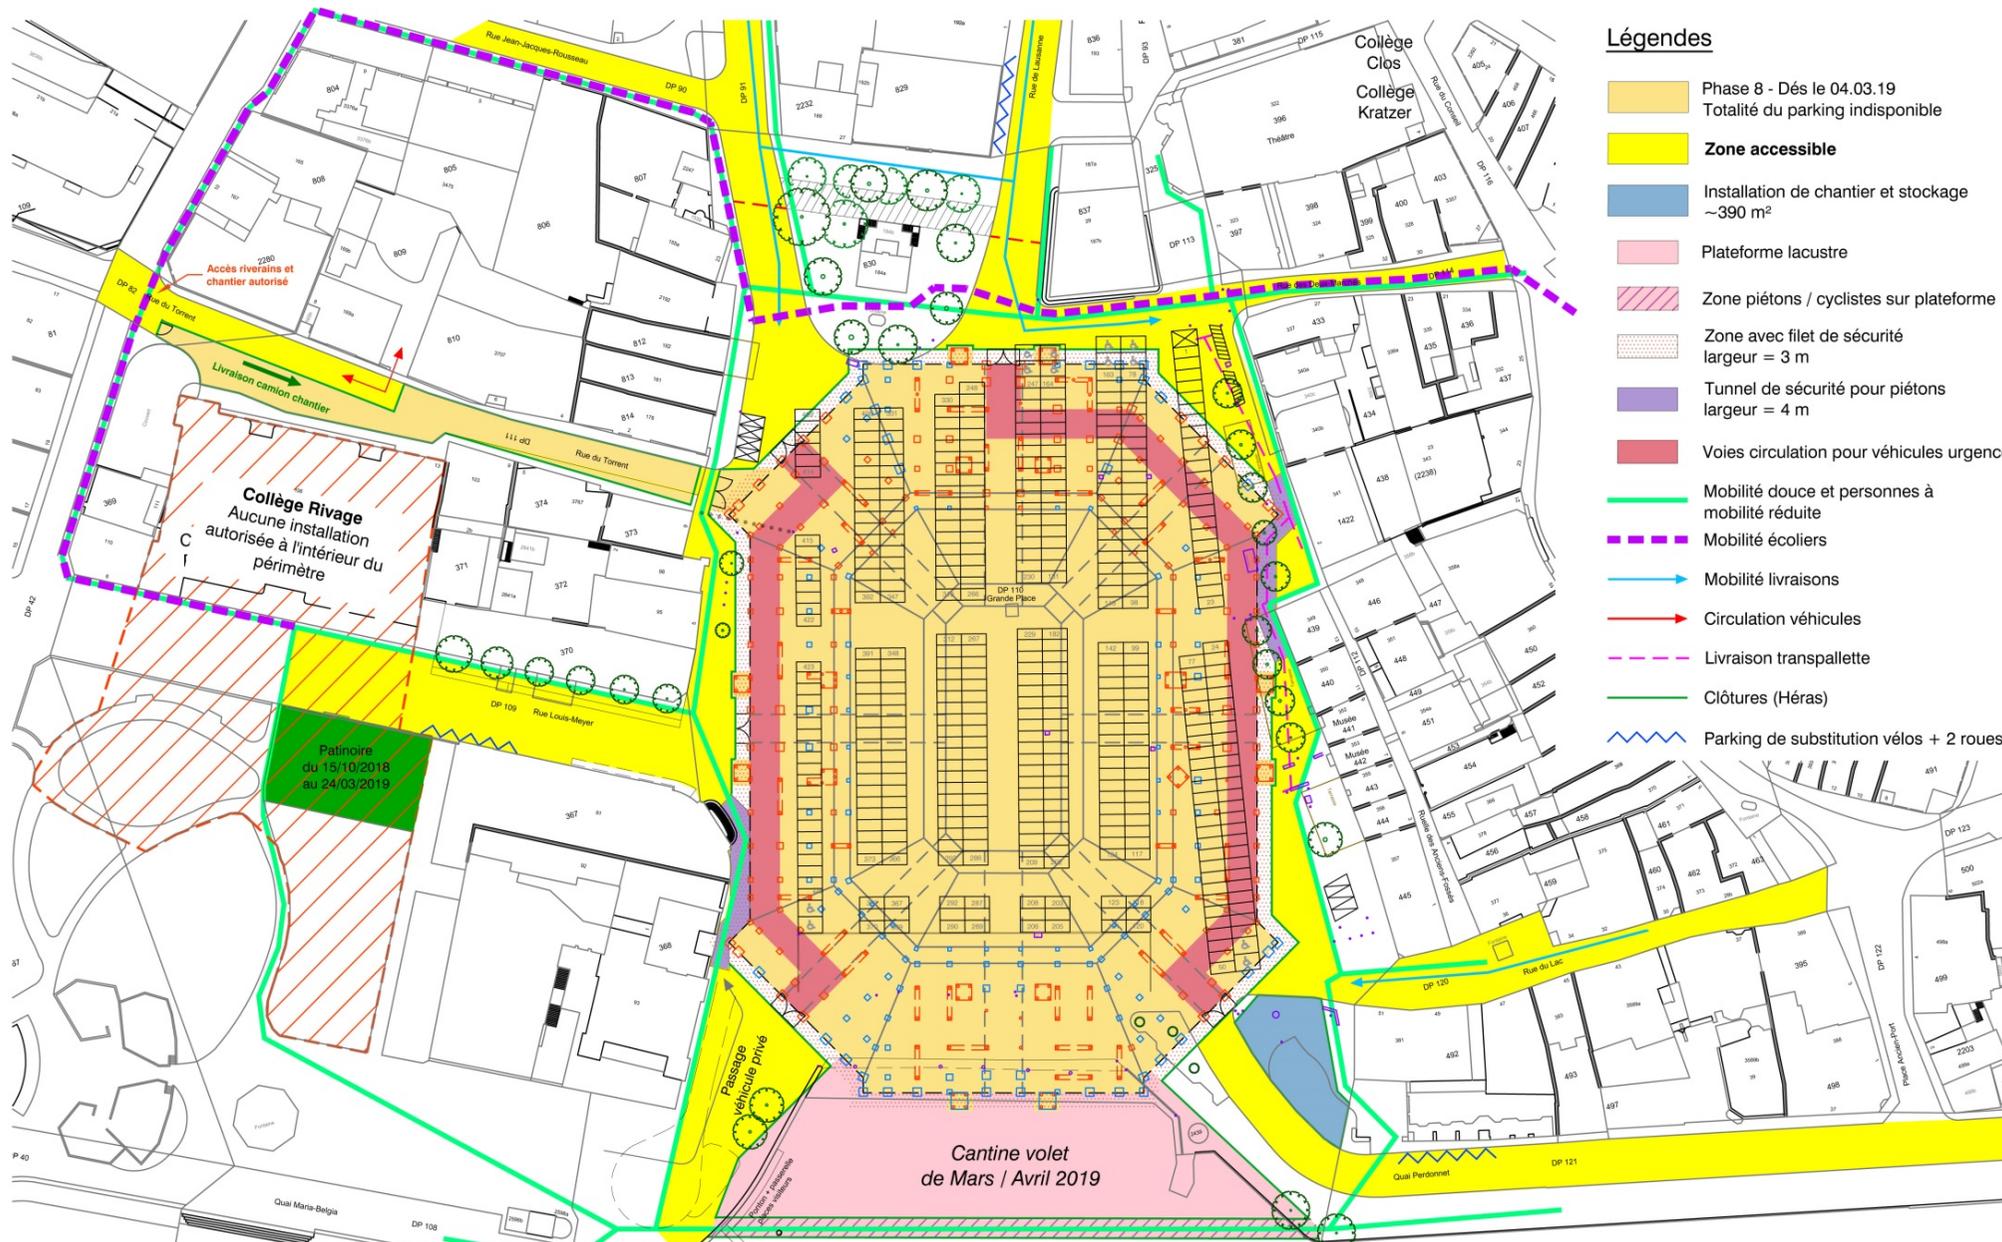

Légendes

- Phase 8 - Dès le 04.03.19
Totalité du parking indisponible
- Zone accessible**
- Installation de chantier et stockage
~390 m²
- Plateforme lacustre
- Zone piétons / cyclistes sur plateforme
- Zone avec filet de sécurité
largeur = 3 m
- Tunnel de sécurité pour piétons
largeur = 4 m
- Voies circulation pour véhicules urgence
- Mobilité douce et personnes à
mobilité réduite
- Mobilité écoliers
- Mobilité livraisons
- Circulation véhicules
- Livraison transpalette
- Clôtures (Héras)
- Parking de substitution vélos + 2 roues

Phase 8
Totalité du parking indisponible

Dès le 04.03.2019


Socles enterrés = 176 pièces Pieux (selon KF SA) = 157 pièces Socles hors-sol = 130 pièces

 <p>Av. des Alpes 43 - 1020 Montreux Tél: +41 21 333 45 00 Av. du 14 Avril 20 - 1020 Renens Tél: +41 21 333 48 30 info@dwill.ch www.dwill.ch</p>	FETE DES VIGNERONS 2019 Commune de Vevey	Date: 05.10.2018 Dessin: DF Contrôle: FT Format: A3 Echelle: 1/1000	N° PLAN 4500-208	
	PHASAGE DES TRAVAUX & MOBILITÉ		PHASE 8	



Parkings

D. Willi, Fête des Vignerons

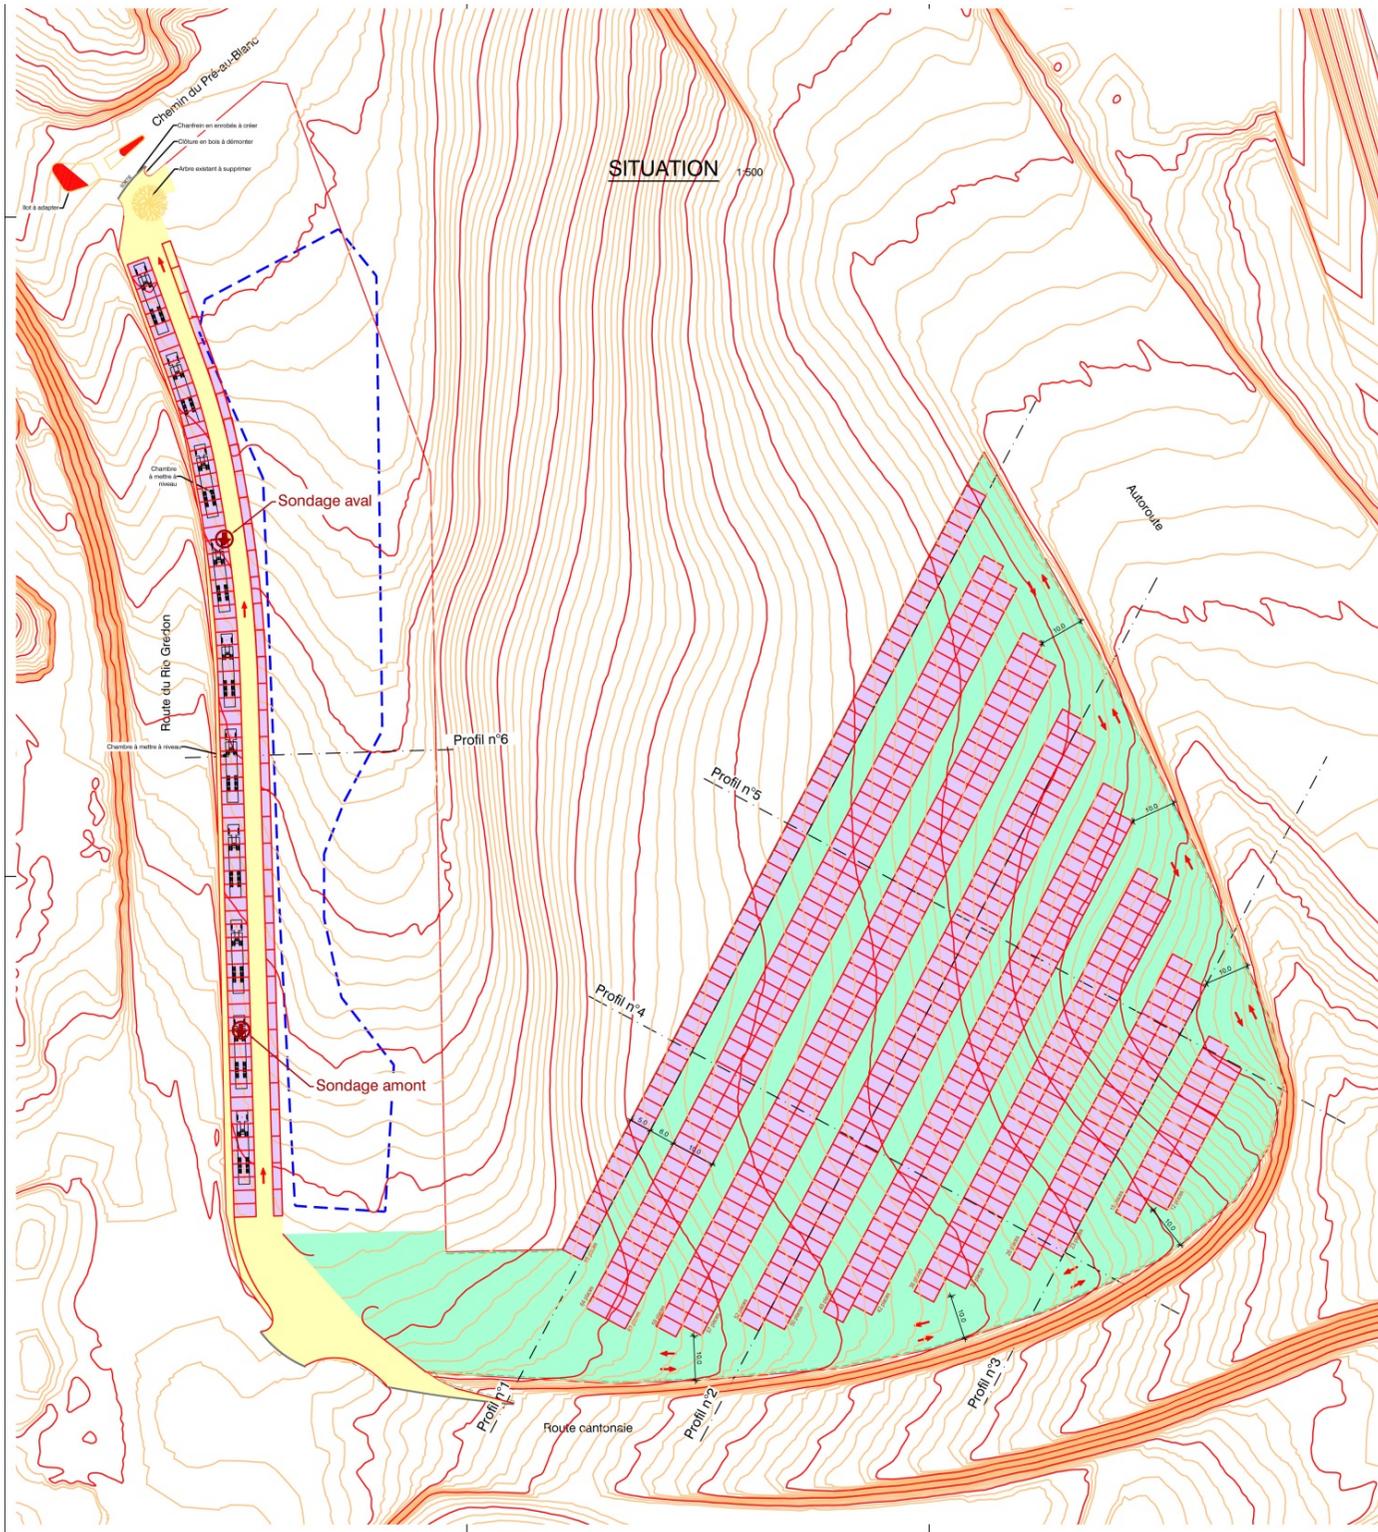


SITUATION 1:500

Légendes

- Place de stationnement (bâtim)
- Circulation parking
- Circulation parking en dur
- Clôture
- Surface de qualité II

Surface du parking : 24451 m²

- Parking pour les semi-remorques (hors fête) = 10 places
durée d'utilisation: 1 an
- Parking pour les voitures (pendant la fête) = 753 places
Ou
- Parking pour les voitures (pendant la fête) = 675 places + 13 emplacements cars
durée d'utilisation: 1 mois

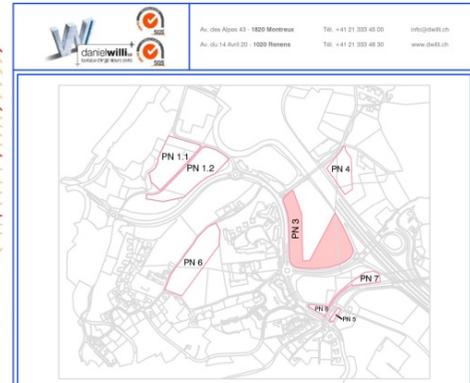

FETE DES VIGNERONS 2019
Création d'un parking parcelle 1824 "Au Pré-Blanc"
1806 Saint-Légier / La Châlesaz

**DEMANDE
D'AUTORISATION**


Journal des modifications					Version initiale
Index	Date	Des.	Visa	Description	

PARKING PN3
PLAN DE SITUATION - variante

Date: 03.09.2018
Dessiné: GW
Coté: GW
Format: A3
Echelle: 1:500

N° PLAN
4500-141

COUPE A - A 1:200




COUPE B - B 1:200



COUPE C - C 1:200



COUPE D - D 1:200




COUPE E - E 1:200




SITUATION 1:500

PN 1.1 - 500 places
 PN 1.2 - 725 places
 (Variante parking durée 1 an - 206 places)
 Total 1275 places

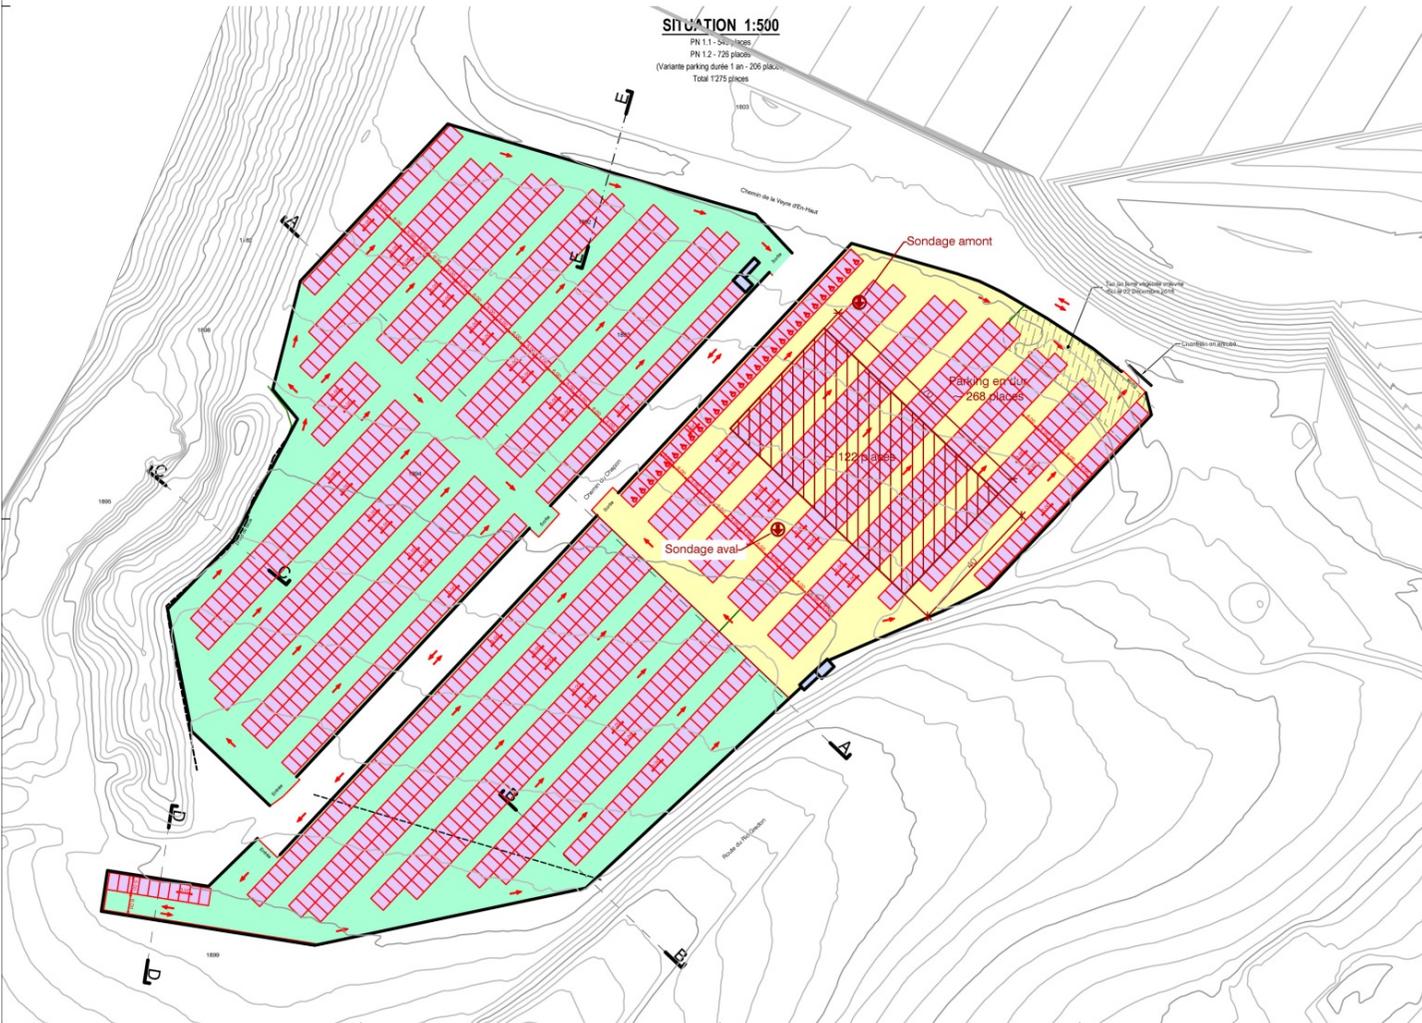

COUPE TYPE 1:20
 VARIANTE PARKING DUREE 1 AN




Légendes

- Place de stationnement (2x3m)
- Circulation parking
- Circulation parking en cours
- Conteneur (Séjour) + WC
- Culture
- Variante parking durée 1 an

Surface PN 1.1 : 16'386 m²
 Surface PN 1.2 : 21'716 m²
 Surface variante parking durée 1 an : 5'922m²


 Av. des Alpes 10 - 1800 Bordeaux Tél. +33 (0) 5 56 40 00 info@vigneron.fr
 Av. de l'Europe 100 - 1800 Bordeaux Tél. +33 (0) 5 56 40 00 www.c-s.fr



FETE DES VIGNERONS 2019
 Création d'un parking parcelles 'La Veyre Derrey'
 1800 Saint-Léger / La Chèze

DEMANDE
 D'AUTORISATION

Journal des modifications				Valeur initiale
N°	Date	Descripteur		
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

PARKING PN1.1-PN1.2
 SITUATION + COUPES
 PLAN D'ENSEMBLE

4500-140



Mobilité, circulation et stationnement

P. Katz, Transitec

Les jalons « mobilité »



Mesures de circulation et stationnement


Phases 1 à 6

(du 15.10.2018 au 1.1.2019)

- **Aucune restriction de circulation.**
- Le stationnement sur la **place du Marché est partiellement indisponible** selon les phases du chantier.

Mesures de circulation

Phases 7 et 8
(du 2.1.2019 à mi-mai 2019)

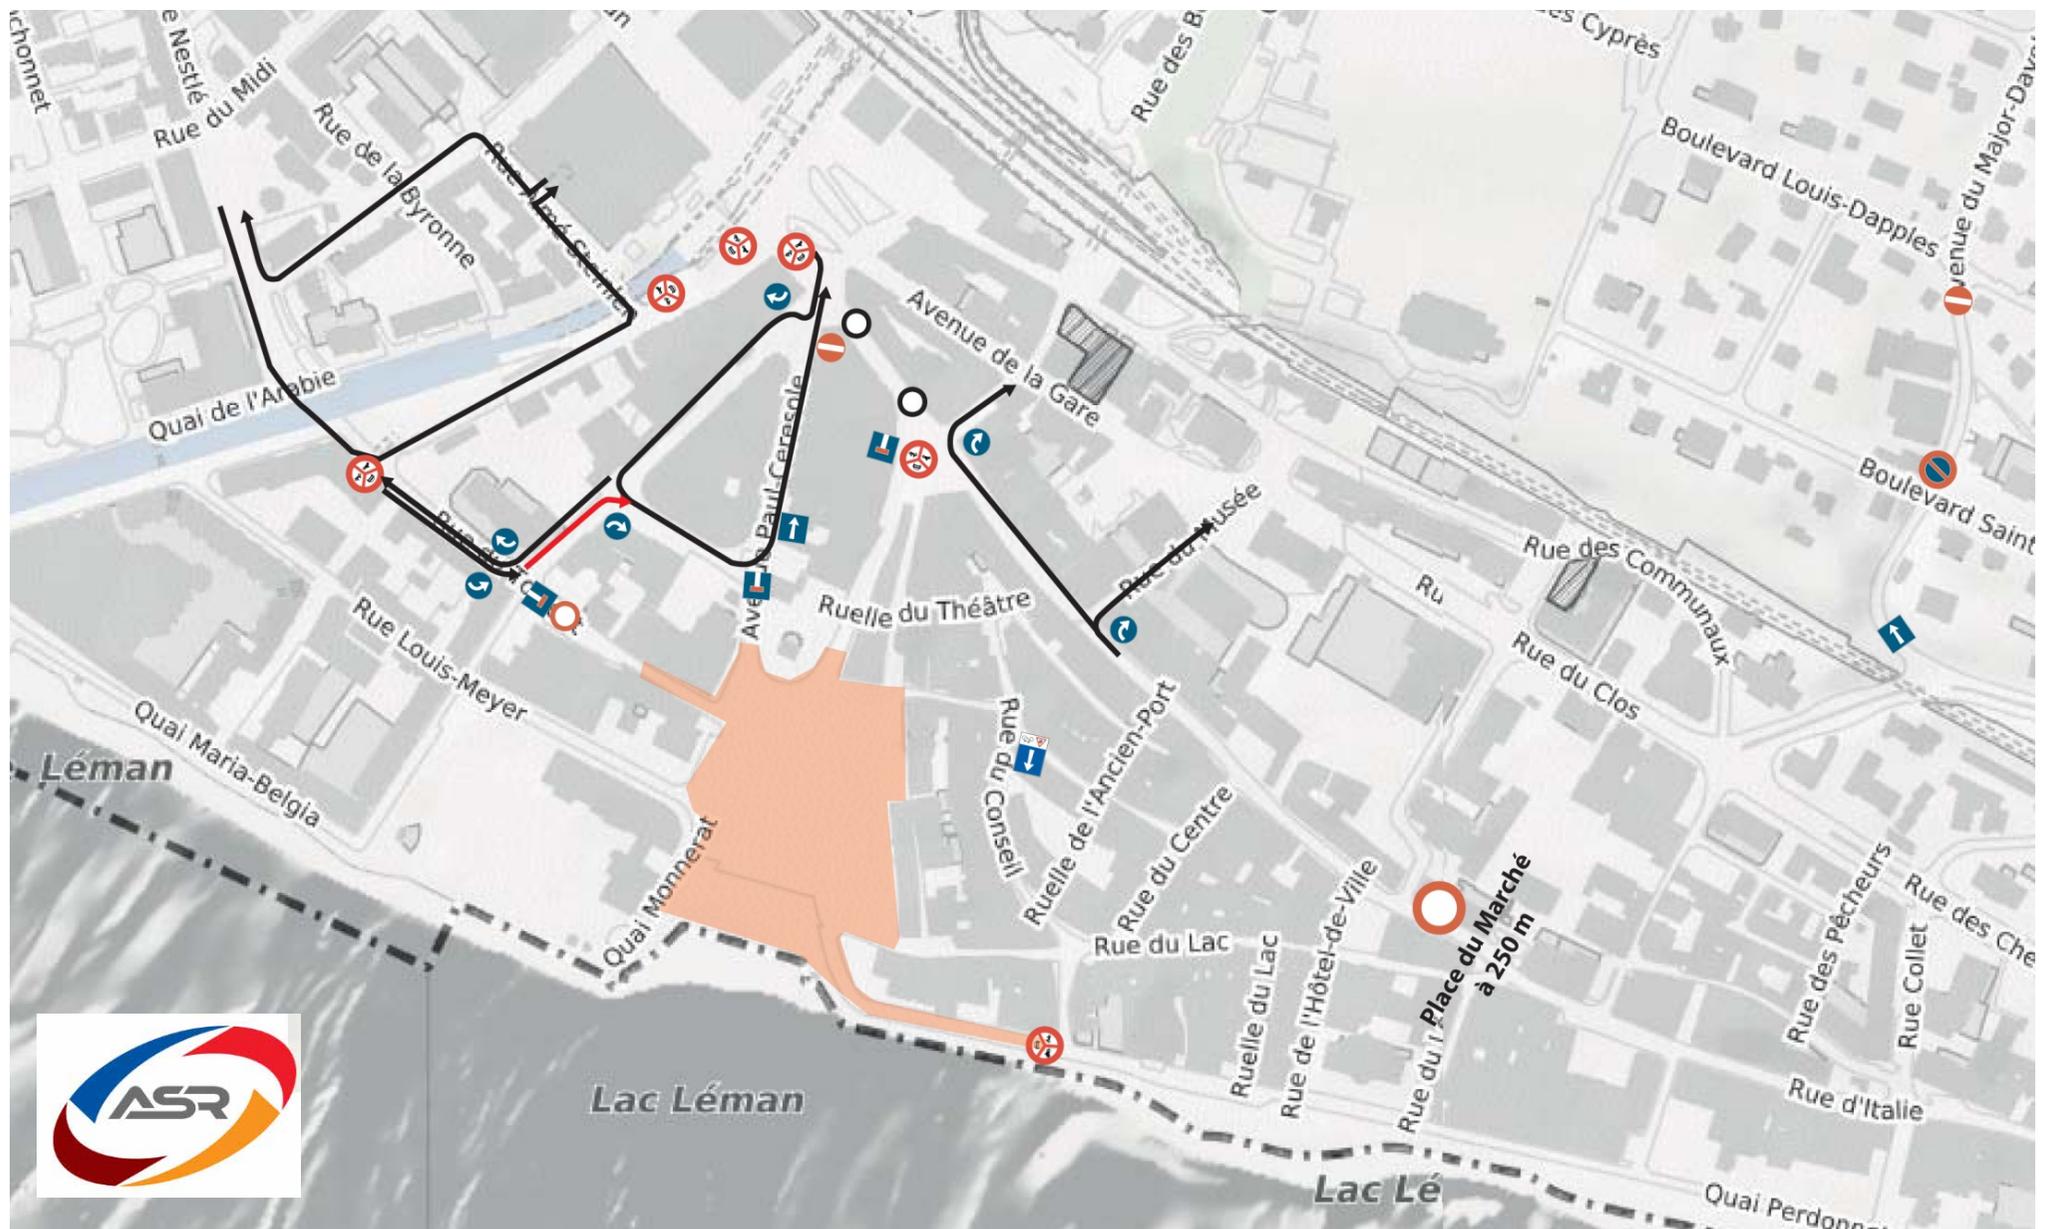

VEVEY

Mesures de stationnement pendant le montage

du 2 janvier 2019 au 14 mai 2019
(reprise du dispositif pour le démontage)

LÉGENDES

Se parquer

- P+R** Parking pendulaires
Max. 11 heures - liaison en bus avec le centre-ville
- P** Parkings en ouvrage
Durées et tarifs selon les exploitations en vigueur
- 3h** Stationnement sur voirie
Max. 3 heures (macarons résidents exceptés)
- 2h** Stationnement sur voirie
Max. 2 heures

Se déplacer

- Arrêts bus
Ligne VMCV
- Gares trains
Ligne MVR
Ligne CFF
- Quai bateaux
Ligne CGN
- A pied
Itinéraire piétons

Phases 7 et 8

(du 2.1.2019 à mi-mai 2019)



Version : oct. 18 - sujet à d'éventuelles modifications
Dernières infos : fetedesvignerons.ch/mobilite

An aerial photograph of a city grid, showing a dense network of streets and buildings. The image is in grayscale and serves as a background for the title and author information.

Outils de l'information

M.-J. Valente, Fête des Vignerons

Outils de l'information

- Affiches «Infos chantier»
- Site internet «Mobilité» & «Infos du jour»
- Flyer «Infos pratiques»

Fête des 20 Vignerons 19

Du 18 juillet
au 11 août

Grande Place
Vevey

Info chantier

Reconnue par l'UNESCO qui l'a inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, la Fête des Vignerons unit les générations, rassemble gens des villes, des campagnes et des vignes, autochtones et étrangers et permet à chacun de se surpasser et de se transcender en participant collectivement à un spectacle unique au monde.

La construction de l'arène qui accueillera ce spectacle exceptionnel sur la Grande Place a débuté le 15 octobre 2018. L'arène disposera d'une capacité totale de 19'000 spectateurs.



Etapes clés

Du 15 octobre 2018 au 1er janvier 2019

Pas de perturbation du trafic durant cette période. Le parking sur la Grande Place reste partiellement disponible. La Grande Place est totalement libérée pour la St-Martin et la période de Noël.

Du 2 janvier 2019 au 14 mai 2019

Un nouveau plan de circulation sera appliqué sur les axes aux abords de la Grande Place qui sera inaccessible. Un parking de substitution pour les pendulaires sera disponible au nord de la ville et accessible en transports publics. Le nombre de zones de stationnement de 2 à 3 heures sera renforcé au centre-ville. Les parkings en ouvrage resteront accessibles. Le parking Manor (env. 440 places) sera ouvert en soirée et la nuit.

Du 15 mai 2019 au 17 juillet 2019

Les répétitions du spectacle avec les acteurs-figurants auront lieu ainsi que les réglages de son et lumière. Les aspects et les mesures liés à la mobilité seront les mêmes que lors de la phase précédente.

Mobilité douce

Une signalisation est mise en place par l'ASR et assure la sécurité des piétons, des personnes à mobilité réduite et des cyclistes durant toutes les phases du chantier. Le centre-ville reste en tout temps facilement accessible en transports publics.

Informations

Les habitants, pendulaires, entreprises et commerçants de Vevey ont la possibilité d'être informés en temps réel de l'état de la mobilité à Vevey durant les travaux qui précèdent la Fête, mais aussi durant la Fête et les semaines de démontage qui suivront les festivités.

En collaboration avec la Ville de Vevey et l'ASR, un système d'information est disponible sur notre site internet, nous vous invitons à le consulter quotidiennement, du début des travaux au démontage de l'arène.

www.fetedesvignerons.ch/mobilite



Fête des 20 Vignerons 19 Du 18 juillet au 11 août Grande Place Vevey

Info chantier Reconnue par l'UNESCO qui l'a inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, la Fête des Vignerons unit les générations, rassemble gens des villes, des campagnes et des vignes, autochtones et étrangers et permet à chacun de se surpasser et de se transcender en participant collectivement à un spectacle unique au monde.

La construction de l'arène qui accueillera ce spectacle exceptionnel sur la Grande Place a débuté le 15 octobre 2018. L'arène disposera d'une capacité totale de 19'000 spectateurs.



Etapes clés
Du 15 octobre 2018 au 1er janvier 2019
 Pas de perturbation du trafic durant cette période. Le parking sur la Grande Place reste partiellement disponible. La Grande Place est totalement libérée pour la St-Martin et la période de Noël.
Du 2 janvier 2019 au 14 mai 2019
 Un nouveau plan de circulation sera appliqué sur les axes aux abords de la Grande Place qui sera inaccessible. Un parking de substitution pour les péniculaires sera disponible au nord de la ville et accessible en transports publics. Le nombre de zones de stationnement de 2 à 3 heures sera renforcé au centre-ville. Les parkings en ouvrage resteront accessibles. Le parking Manor (env. 440 places) sera ouvert en soirée et la nuit.
Du 15 mai 2019 au 17 juillet 2019
 Les répétitions du spectacle avec les acteurs-figurants auront lieu ainsi que les réglages de son et lumière. Les aspects et les mesures liés à la mobilité seront les mêmes que lors de la phase précédente.

Mobilité douce
 Une signalisation est mise en place par l'ASR et assure la sécurité des piétons, des personnes à mobilité réduite et des cyclistes durant toutes les phases du chantier. Le centre-ville reste en tout temps facilement accessible en transports publics.

Informations
 Les habitants, péniculaires, entreprises et commerçants de Vevey ont la possibilité d'être informés en temps réel de l'état de la mobilité à Vevey durant les travaux qui précèdent la Fête, mais aussi durant la Fête et les semaines de démontage qui suivront les festivités.

En collaboration avec la Ville de Vevey et l'ASR, un système d'information est disponible sur notre site internet, nous vous invitons à le consulter quotidiennement, du début des travaux au démontage de l'arène.

www.fetedesvignerons.ch/mobilité



Fête des 20 Vignerons 19 Du 18 juillet au 11 août Grande Place Vevey

Info chantier Reconnue par l'UNESCO qui l'a inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, la Fête des Vignerons unit les générations, rassemble gens des villes, des campagnes et des vignes, autochtones et étrangers et permet à chacun de se surpasser et de se transcender en participant collectivement à un spectacle unique au monde.

La construction de l'arène qui accueillera ce spectacle exceptionnel sur la Grande Place a débuté le 15 octobre 2018. L'arène disposera d'une capacité totale de 19'000 spectateurs.



Etapes clés
Du 15 octobre 2018 au 1er janvier 2019
 Pas de perturbation du trafic durant cette période. Le parking sur la Grande Place reste partiellement disponible. La Grande Place est totalement libérée pour la St-Martin et la période de Noël.
Du 2 janvier 2019 au 14 mai 2019
 Un nouveau plan de circulation sera appliqué sur les axes aux abords de la Grande Place qui sera inaccessible. Un parking de substitution pour les péniculaires sera disponible au nord de la ville et accessible en transports publics. Le nombre de zones de stationnement de 2 à 3 heures sera renforcé au centre-ville. Les parkings en ouvrage resteront accessibles. Le parking Manor (env. 440 places) sera ouvert en soirée et la nuit.
Du 15 mai 2019 au 17 juillet 2019
 Les répétitions du spectacle avec les acteurs-figurants auront lieu ainsi que les réglages de son et lumière. Les aspects et les mesures liés à la mobilité seront les mêmes que lors de la phase précédente.

Mobilité douce
 Une signalisation est mise en place par l'ASR et assure la sécurité des piétons, des personnes à mobilité réduite et des cyclistes durant toutes les phases du chantier. Le centre-ville reste en tout temps facilement accessible en transports publics.

Informations
 Les habitants, péniculaires, entreprises et commerçants de Vevey ont la possibilité d'être informés en temps réel de l'état de la mobilité à Vevey durant les travaux qui précèdent la Fête, mais aussi durant la Fête et les semaines de démontage qui suivront les festivités.

En collaboration avec la Ville de Vevey et l'ASR, un système d'information est disponible sur notre site internet, nous vous invitons à le consulter quotidiennement, du début des travaux au démontage de l'arène.

www.fetedesvignerons.ch/mobilité



Fête des 20 Vignerons 19 Du 18 juillet au 11 août Grande Place Vevey

Info chantier Reconnue par l'UNESCO qui l'a inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, la Fête des Vignerons unit les générations, rassemble gens des villes, des campagnes et des vignes, autochtones et étrangers et permet à chacun de se surpasser et de se transcender en participant collectivement à un spectacle unique au monde.

La construction de l'arène qui accueillera ce spectacle exceptionnel sur la Grande Place a débuté le 15 octobre 2018. L'arène disposera d'une capacité totale de 19'000 spectateurs.

Etape 3 : répétitions Photo Ville en Fête

Etapes clés
Du 15 octobre 2018 au 1er janvier 2019
 Pas de perturbation du trafic durant cette période. Le parking sur la Grande Place reste partiellement disponible. La Grande Place est totalement libérée pour la St-Martin et la période de Noël.
Du 2 janvier 2019 au 14 mai 2019
 Un nouveau plan de circulation sera appliqué sur les axes aux abords de la Grande Place qui sera inaccessible. Un parking de substitution pour les péniculaires sera disponible au nord de la ville et accessible en transports publics. Le nombre de zones de stationnement de 2 à 3 heures sera renforcé au centre-ville. Les parkings en ouvrage resteront accessibles. Le parking Manor (env. 440 places) sera ouvert en soirée et la nuit.
Du 15 mai 2019 au 17 juillet 2019
 Les répétitions du spectacle avec les acteurs-figurants auront lieu ainsi que les réglages de son et lumière. Les aspects et les mesures liés à la mobilité seront les mêmes que lors de la phase précédente.

Mobilité douce
 Une signalisation est mise en place par l'ASR et assure la sécurité des piétons, des personnes à mobilité réduite et des cyclistes durant toutes les phases du chantier. Le centre-ville reste en tout temps facilement accessible en transports publics.

Informations
 Les habitants, péniculaires, entreprises et commerçants de Vevey ont la possibilité d'être informés en temps réel de l'état de la mobilité à Vevey durant les travaux qui précèdent la Fête, mais aussi durant la Fête et les semaines de démontage qui suivront les festivités.

En collaboration avec la Ville de Vevey et l'ASR, un système d'information est disponible sur notre site internet, nous vous invitons à le consulter quotidiennement, du début des travaux au démontage de l'arène.

www.fetedesvignerons.ch/mobilité



Fête des 20 Vignerons 19 Du 18 juillet au 11 août Grande Place Vevey

Info chantier Reconnue par l'UNESCO qui l'a inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, la Fête des Vignerons unit les générations, rassemble gens des villes, des campagnes et des vignes, autochtones et étrangers et permet à chacun de se surpasser et de se transcender en participant collectivement à un spectacle unique au monde.

La construction de l'arène qui accueillera ce spectacle exceptionnel sur la Grande Place a débuté le 15 octobre 2018. L'arène disposera d'une capacité totale de 19'000 spectateurs.

Etape 4 : démontage Photo de la Fête

Etapes clés
Du 15 octobre 2018 au 1er janvier 2019
 Pas de perturbation du trafic durant cette période. Le parking sur la Grande Place reste partiellement disponible. La Grande Place est totalement libérée pour la St-Martin et la période de Noël.
Du 2 janvier 2019 au 14 mai 2019
 Un nouveau plan de circulation sera appliqué sur les axes aux abords de la Grande Place qui sera inaccessible. Un parking de substitution pour les péniculaires sera disponible au nord de la ville et accessible en transports publics. Le nombre de zones de stationnement de 2 à 3 heures sera renforcé au centre-ville. Les parkings en ouvrage resteront accessibles. Le parking Manor (env. 440 places) sera ouvert en soirée et la nuit.
Du 15 mai 2019 au 17 juillet 2019
 Les répétitions du spectacle avec les acteurs-figurants auront lieu ainsi que les réglages de son et lumière. Les aspects et les mesures liés à la mobilité seront les mêmes que lors de la phase précédente.

Mobilité douce
 Une signalisation est mise en place par l'ASR et assure la sécurité des piétons, des personnes à mobilité réduite et des cyclistes durant toutes les phases du chantier. Le centre-ville reste en tout temps facilement accessible en transports publics.

Informations
 Les habitants, péniculaires, entreprises et commerçants de Vevey ont la possibilité d'être informés en temps réel de l'état de la mobilité à Vevey durant les travaux qui précèdent la Fête, mais aussi durant la Fête et les semaines de démontage qui suivront les festivités.

En collaboration avec la Ville de Vevey et l'ASR, un système d'information est disponible sur notre site internet, nous vous invitons à le consulter quotidiennement, du début des travaux au démontage de l'arène.

www.fetedesvignerons.ch/mobilité



Fête des 20 Vignerons 19



Du 18 juillet au 11 août 2019

Une fois par génération seulement, la Fête des Vignerons éblouit plusieurs centaines de milliers de spectateurs à Vevey. Avant le début de cette célébration hors normes et unique au monde, il reste:

281 : 16 : 41 : 07
Jour(s) Heure(s) Minute(s) Seconde(s)



Du 18 Juillet au 11 Août 2019

Reconnue par l'UNESCO qui l'a inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, la Fête des Vignerons unit les générations, rassemble gens des villes, des campagnes et des vignes, autochtones et étrangers et permet à chacun de se surpasser et de se transcender en participant collectivement à un spectacle unique au monde.

[Inscriptions pour l'organisation de la Fête](#)

Fête des 20 Vignerons 19



- [Accueil](#)
- [La Fête](#)
- [Le spectacle](#)
- [Billetterie](#)
- [Hospitalité](#)
- [Equipes](#)
- [Partenaires](#)
- [Newsletter](#)
- [Shop](#)



Informations

La Fête des Vignerons informe les habitants.

Les habitants, pendulaires et commerçants de Vevey ont la possibilité d'être informés en temps réel de l'état de la mobilité à Vevey durant les travaux qui précèdent la Fête, mais aussi durant la Fête et les semaines de démontage qui suivront les festivités.

En collaboration avec la Ville de Vevey et l'ASR, un système d'information est disponible à cet endroit, nous vous invitons à le consulter quotidiennement, du début des travaux au démontage de l'arène. Les autres données seront régulièrement mises à jour afin d'apporter des précisions supplémentaires.

L'organisateur se réjouit de vivre la Fête avec vous.

[Infos du jour](#)



[Infos générales](#)



Fête des 20 Vignerons 19



- [Accueil](#)
- [La Fête](#)
- [Le spectacle](#)
- [Billetterie](#)
- [Hospitalité](#)
- [Equipes](#)
- [Partenaires](#)
- [Newsletter](#)
- [Shop](#)



Infos générales

Accès & parkings – le chantier en 3 étapes

La métamorphose de la Grande Place se fera en 3 principales étapes pour lesquelles des plans de circulation et des parkings de substitution ont été étudiés. Ceci afin de garantir la mobilité en Ville de Vevey. Découvrez toutes les informations utiles, période par période, au moyen des boutons ci-contre.

15 octobre 2018 au 1er janvier 2019

2 janvier 2019 au 14 mai 2019

15 mai 2019 au 17 juillet 2019

Pendant la Fête...

En cours d'étude, sera disponible ultérieurement.



Du 2 janvier 2019 au 14 mai 2019

Accès & parkings

Nouveau plan de circulation :

Dès le 2 janvier 2019, la Grande Place sera entièrement fermée pour permettre la construction de l'arène. Les rues adjacentes seront interdites à la circulation, livraisons, habitants et commerces exceptés. Cette mesure concerne plus précisément la rue du Torrent (partie est), la rue Jean-Jacques Rousseau, l'avenue Paul-Cérésolle, la rue de Lausanne et le tronçon nord du quai de la Veveyse (entre le giratoire de la gare et la rue Aimé-Steinlen). Le tronçon de la rue de la Madeleine entre la rue Jean-Jacques Rousseau et la rue du Torrent sera ouverte à la circulation à double sens. Le quai Perdonnet sera fermé à la circulation entre la Grande Place et la place de l'Ancien-Port.

Places de stationnement :

Afin de maintenir une accessibilité optimale du centre-ville pour les visiteurs et les clients des commerces, les places de stationnement longue durée – aujourd'hui utilisées principalement par les pendulaires – verront leur durée de stationnement raccourcie à 3 heures, macarons résidents exceptés (sur certaines zones). Cette modification concerne l'avenue de Gilamont, la rue des Bosquets et l'avenue de Blonay. La rue des Deux-Gares passera à 2h maximum et l'avenue Major-Davel sera mise en sens unique pour créer une zone de stationnement sur la voie montante.

Parking de substitution :

Un parking longue durée de substitution, payant et destiné aux pendulaires, sera créé au nord de la ville et accessible en [transports publics](#).

Parkings en ouvrage :

Les [parkings en ouvrage](#) restent en tout temps disponibles.

Parking de la Grande Place : Indisponible

Mobilité douce :

Une signalisation sera mise en place par l'ASR et assurera la sécurité des piétons, des personnes à mobilité réduite et des cyclistes durant toutes les phases du chantier.

Transports publics :

Le centre-ville de Vevey reste en tout temps facilement accessible en [transports publics](#).

Dès le 09.12.18 : modification de circulation de la ligne de bus VMCV n°221/212 et suppression de l'arrêt Vevey-Marché.

Perturbations actuelles du trafic

Vous allez être redirigé sur un site externe.

Disponibilités actuelles des parkings publics

Vous allez être redirigé sur un site externe.

Transports publics

Vous allez être redirigé sur un site externe.

Mesures de stationnement pendant le montage



Huit phases du chantier Montage de l'arène (9 pages)



An aerial photograph of a city grid, showing a dense network of streets and buildings. The image is in grayscale and serves as a background for the title and author information.

Mesures d'accompagnement

E. Leimgruber, Syndique



OFFRE
SPÉCIALE
MOBILITÉ
DOUCE

200.-
DE RABAIS
À L'ACHAT
D'UN VÉLO

EN VUE DE LA FÊTE DES VIGNERONS,
LES REVENDEURS CI-CONTRE
OFFRENT UN RABAIS EXCLUSIF DE
CHF 200.- À L'ACHAT D'UN VÉLO
OU VÉLO ÉLECTRIQUE.*

*Offre valable du 1^{er} février au 31 mai 2019 sur
une gamme définie par le magasin partenaire
et dans la limite des stocks disponibles.

Réservée aux Veveysans, habitants des communes
partenaires et employés des entreprises
veveysannes.

ALPI'TRAIL SA - PUIDOUX
ALTMANN SPORTS SA - VEVEY
CYCLES COLIN SÂRL - VEVEY
CYCLES FREDDY JORDAN SA - VEVEY
CYCLOSORTS ALTMANN - MONTREUX
SAM'S BIKE - LA TOUR-DE-PEILZ
STÖCKLI - ST-LÉGIER
TANDEM VELOS ELECTRIQUES - VEVEY
UNICCYCLE SÂRL - FOREL
VALL CYCLE - VEVEY

Communes partenaires: Blonay,
Chardonne, Corsier-sur-Vevey, Jongny,
Montreux, St-Légier - La Chiésaz et Vevey

La Ville de Vevey soutient les commerçants
et la mobilité douce durant la Fête des Vignerons!



dringdring

vous achetez
nous livrons

DÈS LE 15 OCTOBRE 2018,
VOS COURSES LIVRÉES À DOMICILE
GRATUITEMENT*



Demandez un bulletin à la caisse



www.dringdring.ch/riviera

*offre valable 1 an du 15.10.2018 au 14.10.2019 dans la limite des livraisons disponibles

Les commerçants locaux
préparent et livrent vos courses !

youpaq.com



Simple
Rapide
Local



An aerial photograph of the town of Vevey, Switzerland, showing a dense urban layout with numerous buildings, streets, and green spaces. The town is situated along a body of water, which is visible on the left side of the image. The text is overlaid on the central part of the town.

Marché de Vevey

E. Rivier, Municipal



LE MARCHÉ DE VEVEY DÉMÉNAGE



PLACE DES
ANCIENS-FOSSÉS
LA TOUR-DE-PEILZ

PENDANT QUE
LA GRANDE PLACE
EST OCCUPÉE
PAR LA FÊTE
DES VIGNERONS



TOUS LES
MARDIS ET
SAMEDIS

DÈS LE
03.11.2018





Stands d'information

J.-M. Rudaz, Fête des Vignerons



An aerial, grayscale photograph of a city grid, likely Vevey, showing a dense network of streets and buildings. The image is semi-transparent, allowing the text to be overlaid.

Questions générales

An aerial, grayscale photograph of a city grid, likely Vevey, Switzerland, showing a dense network of streets and buildings. The image is semi-transparent, allowing text to be overlaid.

Apéritif

Merci de votre attention
